



SOLICITAÇÃO DE ADITIVO CONTRATUAL



O Fundo Municipal de Saúde de Canaã dos Carajás - PA, pessoa jurídica de direito público, devidamente escrito no CNPJ-MF 11.903.351/0001-29, com sede na Avenida JK, nº 80, Centro – Canaã dos Carajás – PA CEP: 68537- 000, representado neste ato pela Sr. ° Dinilson Jose dos Santos, Secretário Municipal de Saúde, nomeado pela portaria 017/2017-GP, vem respeitosamente encaminhar esta solicitação de aditivo contratual para análise da justificativa, em anexo, e reconhecimento do pedido.

DO AMPARO LEGAL

O termo aditivo será amparado legalmente pelo artigo 65, parágrafo 1º, alínea b da lei 8.666/93 que diz:

“Art.: 65 Os Contratos regidos por esta lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: ”

“ (B) quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta lei; ”

“§1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos. ”

DO CONTRATO

O contrato em que se solicita o pleito em tela é o de nº **20141120**, decorrente da tomada de preços **143/2014 – CPL**, que tem como Contratada a Empresa **R A CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME** escrita no **CNPJ (MF): 10.576.869/0001-32** cujo objetivo é:



“A contratação de empresa para execução de obra de uma unidade de saúde da família localizada na Rua Cumaru, Centro, zona urbana do município de Canaã dos Carajás - PA”.



DA JUSTIFICATIVA

A justificativa para o referido termo aditivo se encontra em anexo, devidamente assinada pelo responsável técnico pela fiscalização dos serviços e reconhecida como válida através deste termo pela Secretária Municipal de Educação que o assina.

Acostado nos autos ainda temos a solicitação da empresa, bem como planilha orçamentaria relativa ao aditivo e memorial de cálculo detalhado para levantamento do quantitativo elencado na planilha orçamentaria.

DA DESPESA

A despesa com o fornecimento dos serviços de que trata o objeto se dará através da dotação orçamentaria exercício de 2017, atividade 10.301.1331.1.043 construir unidades de saúde da família, Classificação Econômica 4.4.90.51.00 Obras e Instalações, Fonte de Recurso 010000.

DO PEDIDO

Face ao exposto, vista a justificativa e a indicação orçamentaria, vimos respeitosamente requerer o aditivo ao contrato Nº 20141120, ficando desde já autorizada a comissão permanente de licitação a tomar as providencias cabíveis quanto à lavratura do termo aditivo, recolhimento de assinaturas e a publicação do mesmo na imprensa oficial onde o termo original fora publicado.




PLANILHA DESCRITIVA

Nº	DESCRIÇÃO	VALOR INICAL DO CONTRATO	PERCENTUAL A SER ADITIVADO (aproximado)	VALOR A SER ACRESCIDO
1	A contratação de empresa para execução de obra de uma unidade de saúde da família localizada na Rua Cumaru, Centro, zona urbana do município de Canaã dos Carajás – PA.	R\$ 407.391,98	16,17%	R\$ 65.902,05

TOTAL DO ADITIVO
R\$ 65.902,05

VALOR INICIAL DO CONTRATO
R\$ 407.391,98

VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO
R\$ 473.294,03


Dinilson José dos Santos
Portaria Nº 047/2017 - GP
Secretário Municipal de Saúde



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Avenida Jk, Nº 80, Centro – Canaã dos Carajás – PA CEP: 68537- 000.



DESPACHO

Ao setor competente para providencia pesquisa de previa manifestação sobre a existência de recurso orçamentário para cobertura das despesas, com vista à Formalização de termo aditivo ao contrato nº 20141120 que tem como objetivo a contratação de empresa para execução de obra de uma unidade de saúde da família localizada na Rua Cumaru, Centro, zona urbana do município de Canaã dos Carajás - PA.



Dinilson José dos Santos
Portaria Nº 017/2017 - GP
Secretário Municipal de Saúde



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS



DESPACHO

Ao Ilm.º Srº

Dinilson José dos Santos

Em atendimento ao Art. 14 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, informamos a Vossa Senhoria a existência de crédito orçamentário para atender as despesas citadas abaixo:

“Contratação de Empresa para execução de obra de uma unidade básica de saúde da família localizada na Rua Cumaru, zona urbana do Município de Canaã dos Carajás – PA”.

A despesa será consignada à seguinte dotação orçamentária: Exercício 2017 Atividade:

10.301.1333.1.043 – Construir unidades de saúde da família

4.4.90.51.00 – Obras e Instalações

No valor de R\$ 65.902,05 (sessenta e cinco mil novecentos e dois reais e cinco centavos).

Fonte: 010000

Canaã dos Carajás (PA) 31 de Julho de 2017.

Rivaldo Mendes da Silva
Gestor do Setor
Portaria 408/2014 - GP



DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Declaro para os devidos fins, que o aditivo ao contrato nº 20141120 que tem como objetivo a contratação de empresa para execução de obra de uma unidade de saúde da família localizada na Rua Cumaru, Centro, zona urbana do município de Canaã dos Carajás - PA, solicitado à Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás/PA, não comprometerá o Orçamento de 2017, conforme estabelece o inciso I do artigo 16 da Lei complementar federal N.º 101, de 04 de março de 2000, estando de acordo com o inciso II, do mesmo artigo.

Existe também adequação orçamentária e financeira com LOA (Lei Orçamentária Anual), tendo, ainda, compatibilidade com a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias).



Dinilson José dos Santos
Portaria Nº 017/2017 - GP
Secretário Municipal de Saúde



JUSTIFICATIVA PARA TERMO ADITIVO CONTRATUAL

À

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás – PA

Secretária de Saúde

Assunto: Termo aditivo de uma Unidade Básica de Saúde

Obra: Construção de uma Unidade Básica de saúde, localizada na Rua Cumaru com a Rua Paraju, Qd.: 20, Lt.:11- Bairro: Centro, Zona Urbana do Município de Canaã dos Carajás - PA.

CONTRATO Nº. 20141120

CONTRATADA:

Razão Social: RA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP

Nome Fantasia: FLÓRIDA CONSTRUTORA

CREA: 28637 D - PA

Endereço: Rua Rio Maria nº 300, Bairro Morada da Paz – Redenção – PA

Fone (fax): (094) 3356 - 0249 / 99162 - 2670

E-mail: floridaconstrutora@hotmail.com

JUSTIFICATIVA:

Em função de mudanças no aspecto físico da obra, em virtude inclusive dos relacionados às condições do terreno, houve um aumento no volume de materiais e serviços, ocasionando a necessidade de alterações na planilha orçamentária por meio de aditivo. Foi necessário o aditivo de alguns itens da planilha orçamentária, muito em função de novas realidades encontradas na obra e/ou da melhora de seu futuro funcionamento. Segue abaixo os itens a serem adicionados:

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA – A unidade Básica de Saúde está localizada na esquina das Ruas Cumaru e Paraju, provocando assim um aumento na movimentação de terra.


Carlos Augusto Barbosa Gomes
Engenheiro Civil
CREA 9122 - D/PA
Matricula 0101313



Figura 1- MOVIMENTAÇÃO DE TERRA – detalhes no nível da obra.

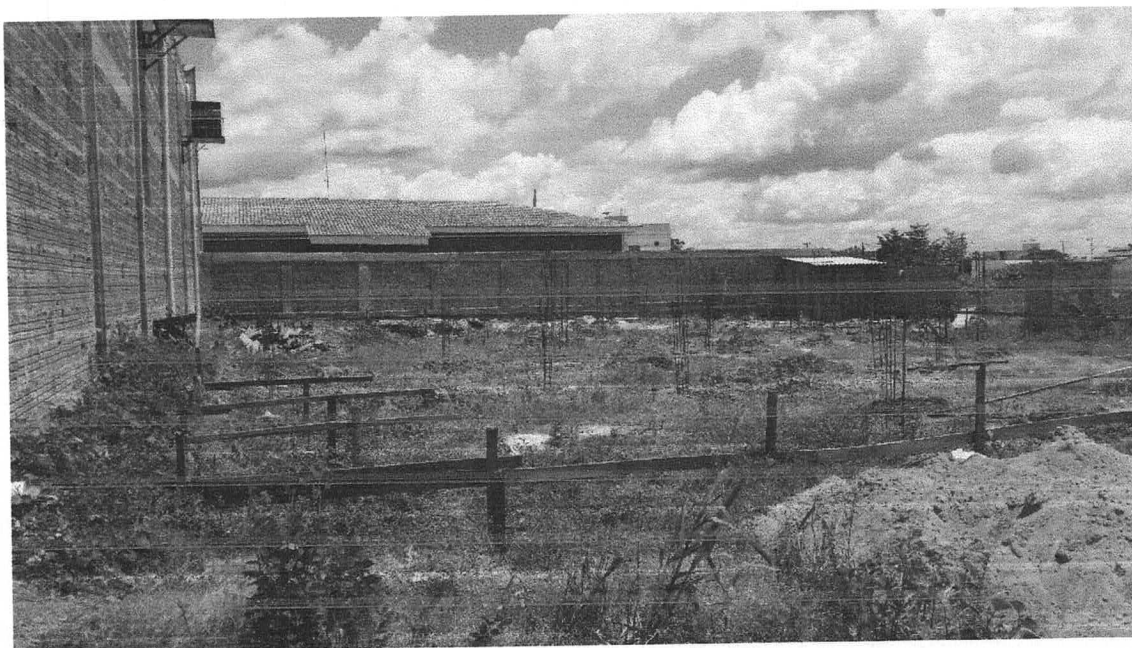


Figura 2 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA.

LOCAÇÃO

A padronização da entrada das unidades Básicas do município foi implementada para esta unidade e provocou um aumento na locação da obra.


Carlos Augusto Barbosa Gomes
Engenheiro Civil
CREA 9122 - DIPA
Matricula 0101313

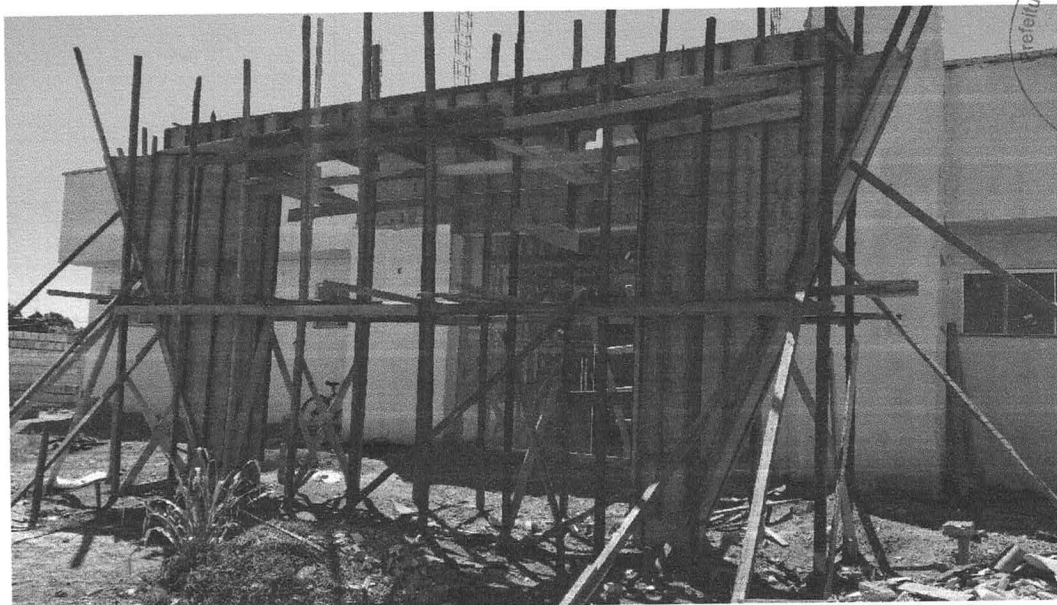


Figura 3 – PÓRTICO CONSTRUÍDO NO ACESSO PRINCIPAL DO PRÉDIO.

FUNDAÇÃO

Durante a escavação da fundação foi observado uma grande quantidade de lixo. De posse desta constatação foram feitos dos furos de inspeção para avaliar a profundidade da camada de lixo. A solução encontrada para esta nova realidade foi aumento da profundidade das estacas. Com isso, os itens relacionados a fundação (armação, forma, concreto e escavação) sofreram aditivo.

A figura 4 abaixo apresenta a inspeção realizada através de um poço

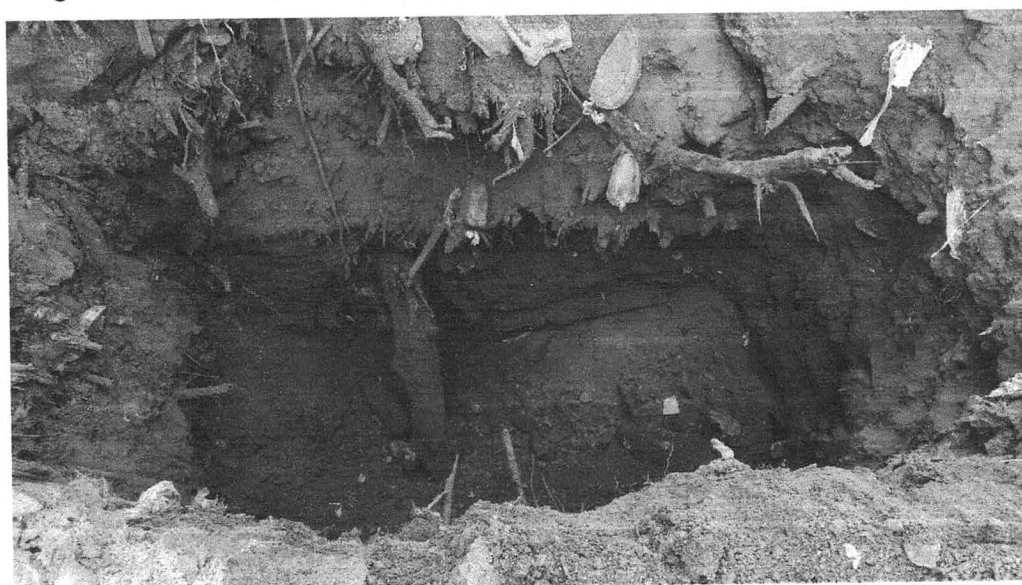


Figura 4 – Inspeção do solo.

O procedimento de perfuração da fundação teve mecanizado para alcançar a profundidade determinadas no novo projeto de fundação, possibilitando estacas com capacidade de carga compatível com a obra.

A figura 4 mostra a perfuração da fundação sendo executada na unidade de Saúde, a figura 5 mostra o detalhe das armações da estaca

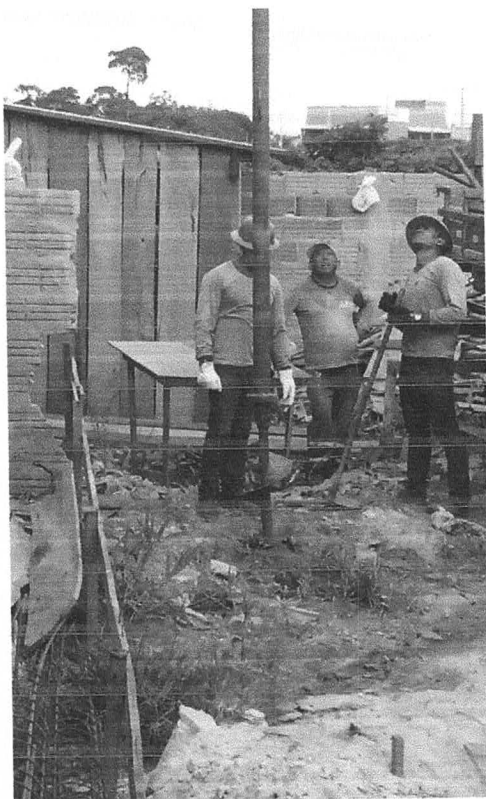


Figura 4 – Perfuração mecanizada


Carlos Augusto Barbosa Gomes
Engenheiro Civil
CREA 9422 - D/PA
Matricula 0101313

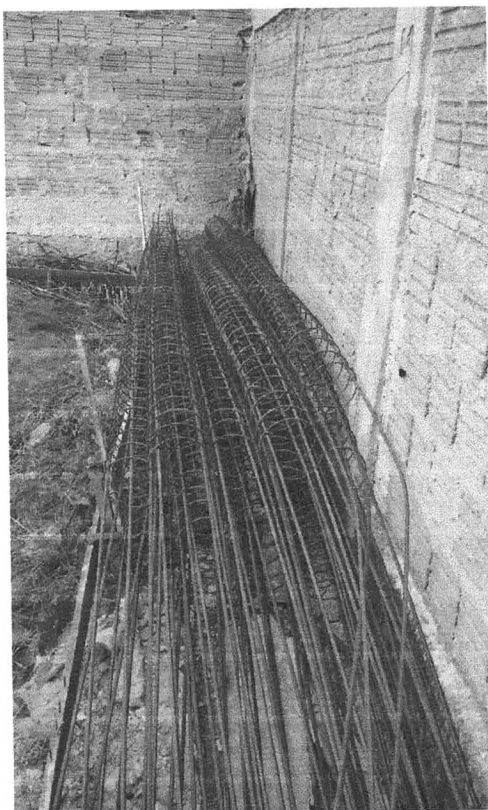


Figura 5 – Armação da estaca

A introdução de pilares para a padronização da entrada das unidades Básica de Saúde do município também colaborou para o acréscimo no serviço de fundação e estrutura em todos os seus itens.

MURO DE VEDAÇÃO

A planilha não contemplou o muro em sua totalidade, sendo necessário o acréscimo de seus itens.



Figura 6 – Muro de Vedação



CALÇADAS

A planta de implantação apresentou um quantitativo de calçadas maior do que o previsto em planilha, ocasionando um aumento de todos os itens relacionados a calçada.

COBERTURA EM POLICARBONATO, INCLUINDO ESTRUTURA METÁLICA

Com as alterações previstas para o acesso principal (Foto 3), a área apresenta quantitativo maior do que o previsto em planilha e por isso a necessidade do acréscimo para este item. A adequação da entrada principal proporcionará maior proteção contra intempéries aos usuários.

RECEPÇÃO E FARMÁCIA

Foi realizada uma adaptação da recepção, com o objetivo de atender melhor aos públicos e também aos profissionais que lá trabalharam. Para isso houve aumento de ESTACAS, ALVENARIA, VIGAS BALDRAME (concreto, forma e armação). Outros itens estão a luz desta mesma análise, como:

_IMPERMEABILIZAÇÃO; RODAPÉ; PAREDES; CHAPISCO EM PAREDES; EMBOÇO; EMASSAMENTO; INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; PINTURA; PORTA; EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA; FECHADURA; entre outros




Carlos Augusto Barbosa Gomes
Engenheiro Civil
CREA 9122 - D/PA
Matricula 0101313

Figura 3 – RECEPÇÃO: VISTA GERAL INTERNA DA RECEPÇÃO



Alguns detalhes ainda foram inclusos para garantir maior qualidade na obra como o caso da pingadeira para permitir maior proteção da edificação contra águas pluviais, dentre outros.

CALHAS E RUFOS

Com o aumento das áreas da edificação e algumas introduções de calhas e rufos para a melhoria do funcionamento do telhado, este foi um item que também sofreu acréscimo.

Atenciosamente,

Canaã dos Carajás, 06 de julho de 2017.

Carlos Augusto Barbosa Gomes
Engenheiro Civil, M.Sc.
Matrícula 0101313
CREA 9122/D-PA

Carlos Augusto Barbosa Gomes
Engenheiro Civil
CREA 9122 - D/PA
Matrícula 0101313



JUSTIFICATIVA PARA TERMO ADITIVO CONTRATUAL

À

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás – PA
Secretária de Saúde

Assunto: Termo aditivo de uma Unidade Básica de Saúde

Obra: Construção de uma Unidade Básica de saúde, localizada na Rua Cumaru com a Rua Paraju, Qd.: 20, Lt.:11- Bairro: Centro, Zona Urbana do Município de Canaã dos Carajás - PA.

CONTRATO Nº. 20141120

CONTRATADA:

Razão Social: RA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP

Nome Fantasia: FLÓRIDA CONSTRUTORA

CREA: 28637 D - PA

Endereço: Rua Rio Maria nº 300, Bairro Morada da Paz – Redenção – PA

Fone (fax): (094) 3356 - 0249 / 99162 - 2670

E-mail: floridaconstrutora@hotmail.com

JUSTIFICATIVA:

Em função de mudanças no aspecto físico da obra, em virtude inclusive dos relacionados às condições do terreno, houve um aumento no volume de materiais e serviços, ocasionando a necessidade de alterações na planilha orçamentária por meio de aditivo. Foi necessário o aditivo de alguns itens da planilha orçamentária, muito em função de novas realidades encontradas na obra e/ou da melhora de seu futuro funcionamento. Segue abaixo os itens a serem adicionados:

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA – A unidade Básica de Saúde está localizada na esquina das Ruas Cumaru e Paraju, provocando assim um aumento na movimentação de terra.


Carlos Augusto Barbosa Gomes
Engenheiro Civil
CREA 9122 - D/PA
Matrícula 010131



Figura 1- MOVIMENTAÇÃO DE TERRA – detalhes no nível da obra.

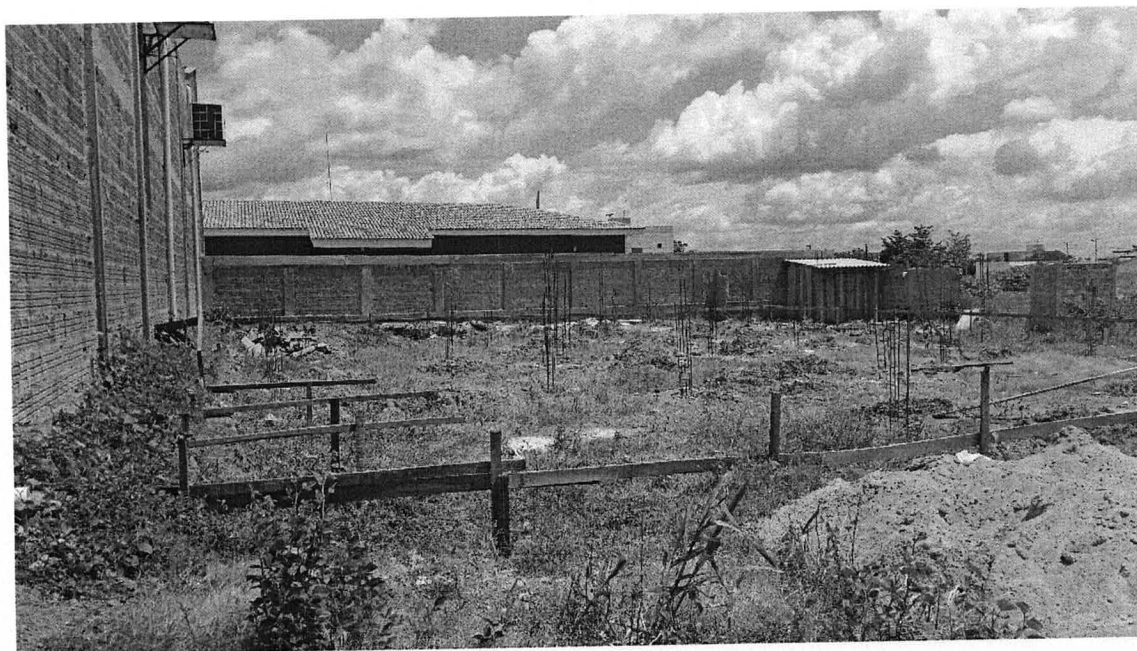


Figura 2 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA.

LOCAÇÃO

A padronização da entrada das unidades Básicas do município foi implementada para esta unidade e provocou um aumento na locação da obra.


Carlos Augusto Barbosa 001
Engenheiro Civil
CREA 9122 - D/P^ª
Matricula 010131

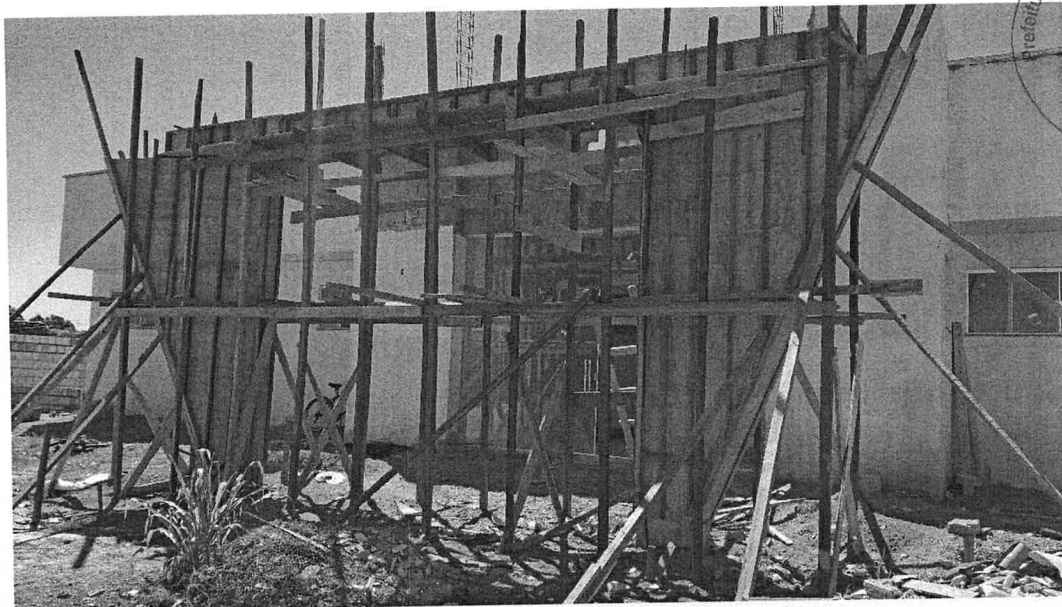


Figura 3 – PÓRTICO CONSTRUÍDO NO ACESSO PRINCIPAL DO PRÉDIO.

FUNDAÇÃO

Durante a escavação da fundação foi observado uma grande quantidade de lixo. De posse desta constatação foram feitos dos furos de inspeção para avaliar a profundidade da camada de lixo. A solução encontrada para esta nova realidade foi aumento da profundidade das estacas. Com isso, os itens relacionados a fundação (armação, forma, concreto e escavação) sofreram aditivo.

A figura 4 abaixo apresenta a inspeção realizada através de um poço



Figura 4 – Inspeção do solo.



O procedimento de perfuração da fundação teve mecanizado para alcançar a profundidade determinadas no novo projeto de fundação, possibilitando estacas com capacidade de carga compatível com a obra. A figura 4 mostra a perfuração da fundação sendo executada na unidade de Saúde, a figura 5 mostra o detalhe das armações da estaca

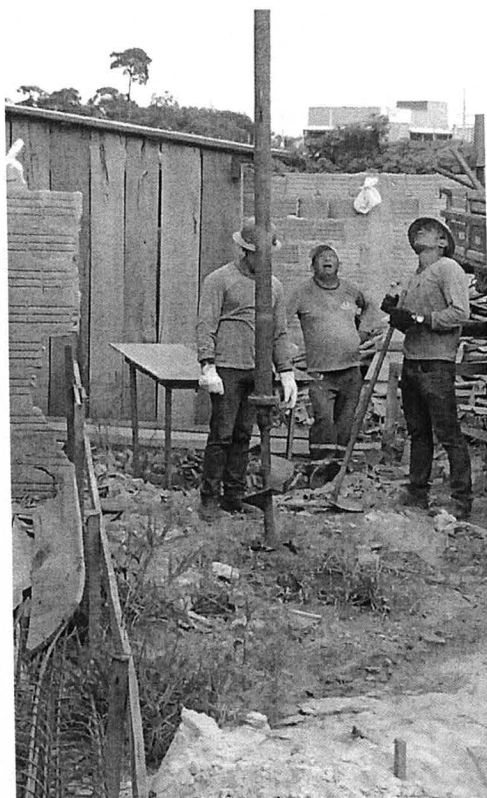


Figura 4 – Perfuração mecanizada


Carlos Augusto Barbosa Gomes
Engenheiro Civil
CREA 9122 - D/PA
Matricula 0101313

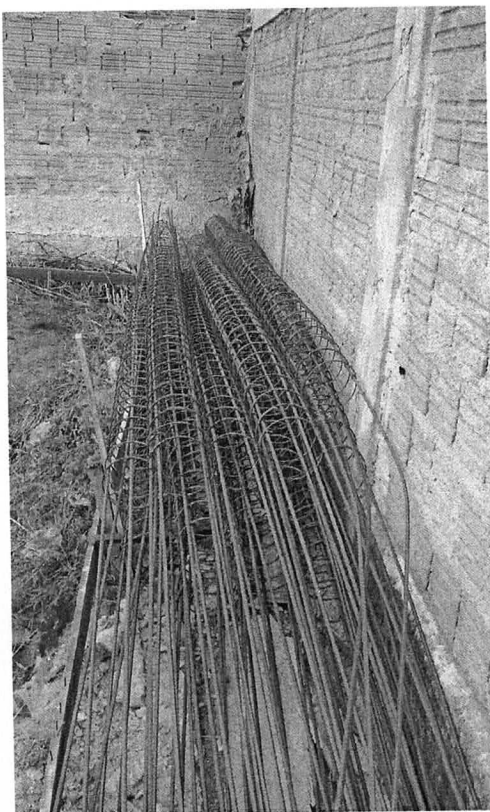


Figura 5 – Armação da estaca

A introdução de pilares para a padronização da entrada das unidades Básica de Saúde do município também colaborou para o acréscimo no serviço de fundação e estrutura em todos os seus itens.

MURO DE VEDAÇÃO

A planilha não contemplou o muro em sua totalidade, sendo necessário o acréscimo de seus itens.



Figura 6 – Muro de Vedação


Carlos Augusto Barbosa Gomes
Engenheiro Civil
CREA 9122 - D/PA
Matrícula 0104313

CALÇADAS

A planta de implantação apresentou um quantitativo de calçadas maior do que o previsto em planilha, ocasionando um aumento de todos os itens relacionados a calçada.

COBERTURA EM POLICARBONATO, INCLUINDO ESTRUTURA METÁLICA

Com as alterações previstas para o acesso principal (Foto 3), a área apresenta quantitativo maior do que o previsto em planilha e por isso a necessidade do acréscimo para este item. A adequação da entrada principal proporcionará maior proteção contra intempéries aos usuários.

RECEPÇÃO E FARMÁCIA

Foi realizado uma adaptação da recepção, com o objetivo de atender melhor aos públicos e também aos profissionais que lá trabalharam. Para isso houve aumento de ESTACAS, ALVENARIA, VIGAS BALDRAME (concreto, forma e armação). Outros itens estão a luz desta mesma análise, como:

_IMPERMEABILIZAÇÃO; RODAPÉ; PAREDES; CHAPISCO EM PAREDES; EMBOÇO; EMASSAMENTO; INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; PINTURA; PORTA; EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA; FECHADURA; entre outros



Figura 3 – RECEPÇÃO: VISTA GERAL INTERNA DA RECEPÇÃO



Alguns detalhes ainda foram inclusos para garantir maior qualidade na obra como o caso da pingadeira para permitir maior proteção da edificação contra águas pluviais, dentre outros.



CALHAS E RUFOS

Com o aumento das áreas da edificação e algumas introduções de calhas e rufos para a melhoria do funcionamento do telhado, este foi um item que também sofreu acréscimo.

Atenciosamente,

Canaã dos Carajás, 06 de julho de 2017.

Carlos Augusto Barbosa Gomes
Engenheiro Civil, M.Sc.
Matrícula 0101313
CREA 9122/D-PA

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS – PA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSUNTO: ADITIVO DE VALOR REFERENTE AO CONTRATO 20141120

Canaã dos Carajás - PA, 24 de Abril de 2017.

REQUERIMENTO

R A CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, regularmente constituída e inscrita no CNPJ sob n.º 10.576.869/0001-32, sediada em Redenção/PA, Rua Rio Maria, 300 – Morada da Paz, – CEP: 68550-545, registrada no CREA/PA sob n.º 8936-EM-PA, detentora do Contrato 20141120 junto ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANAÃ DOS CARAJÁS – PA vem REQUERER aditivo de valor referente a alguns itens da planilha orçamentária para a perfeita finalização da obra e eficiente funcionamento da unidade. Alguns itens foram acrescidos para atender as demandas encontradas mediante a execução da obra das quais foram necessárias adequações que vão desde a regularização e tamanho do terreno; fechamento do terreno com muro; layout da edificação; fluxo de uso e funcionamento da unidade, dentre outras. Estas adequações acarretaram alterações nas quantidades de alguns dos seguintes serviços:

Mobilização;

Movimentação de terra;

Cobertura;

Fundação e Estrutura;

Alvenaria e vedação;

Muro;

Impermeabilização;

Revestimentos – Piso/Parede

Esquadrias – Madeira - Vidro;

Instalações elétricas e hidráulicas.

Por esses motivos peço deferimento.




R A CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ/MF n.º 10.576.869/0001-32

Rua Rio Maria, 300 – Morada da Paz, – CEP: 68550-545 Redenção/PA.

Tel./ Fax.: (94) 3424-0249





Contrato Nº: 2014/120
Contratada: R. A. CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
Objeto: EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NA RUA CUMARÚ, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA.
TOMADA DE PREÇOS Nº: 062014FMS-CPL

CNPJ: 10.576.889/0001-32

Valor do Contrato: R\$ 407.392,01

Página:

PROPOSTA DE ADITIVO 01 - TOMADA DE PREÇOS 05/2014/FMS-CPL

CONTRATO Nº 2014/120

CONTRATADO		MEDÇÃO FISCAL-FINANCEIRA - ADITIVO		Valor Total do Aditivo	
Nº OS	Descrição do Serviço	Unid.	Valor	Unitário	Valor
1	MOBILIZAÇÃO - ENTERRAMENTO DE OBRA	M2	15,542,9	4,50	315,12
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE -	M2	1.418,04	297,30	6,01
1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE CABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS	M2	1.666,17	66,00	33,74
1.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE CABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS	M2	2.226,94	629,73	0,30
1.4	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE CABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS	M2	248,92	1,00	1.003,10
1.5	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE CABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS	M2	735,00	1,00	735,00
1.6	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE CABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS	M2	358,82	1,00	358,82
1.7	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE CABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS	M2	1.444,59	10,00	164,45
1.8	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE CABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS	M2	1.413,00	16,40	141,30
1.9	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE CABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS	M2	2.831,96	61,83	28,70
2	MOBILIZAÇÃO - ENTERRAMENTO DE OBRA	M2	1.774,52	40,22	12,53
2.1	MOBILIZAÇÃO - ENTERRAMENTO DE OBRA	M2	40,96	31,82	9,00
2.2	MOBILIZAÇÃO - ENTERRAMENTO DE OBRA	M2	10,73	31,82	9,00
2.3	MOBILIZAÇÃO - ENTERRAMENTO DE OBRA	M2	133,64	31,82	4,20
2.4	MOBILIZAÇÃO - ENTERRAMENTO DE OBRA	M2	38.355,46	286,84	58,00
3	MOBILIZAÇÃO - ENTERRAMENTO DE OBRA	M2	16.642,52	286,84	25,94
3.1	MOBILIZAÇÃO - ENTERRAMENTO DE OBRA	M2	7.443,22	29,83	10,62
3.2	MOBILIZAÇÃO - ENTERRAMENTO DE OBRA	M2	2.849,36	29,83	6,07
3.3	MOBILIZAÇÃO - ENTERRAMENTO DE OBRA	M2	3.659,44	29,83	13,74
3.4	MOBILIZAÇÃO - ENTERRAMENTO DE OBRA	M2	1.174,74	29,83	30,30
3.5	MOBILIZAÇÃO - ENTERRAMENTO DE OBRA	M2	2.933,40	59,88	15,00
3.6	MOBILIZAÇÃO - ENTERRAMENTO DE OBRA	M2	5.756,31	298,10	13,35
4	MOBILIZAÇÃO - ENTERRAMENTO DE OBRA	M2	79.146,62	206,00	31,40
4.1	MOBILIZAÇÃO - ENTERRAMENTO DE OBRA	M2	6.531,20	104,00	6,17
4.2	MOBILIZAÇÃO - ENTERRAMENTO DE OBRA	M2	641,68	1,30	1,32
4.3	MOBILIZAÇÃO - ENTERRAMENTO DE OBRA	M2	168,91	218,32	1,96
4.4	MOBILIZAÇÃO - ENTERRAMENTO DE OBRA	M2	3.709,26	903,48	36,67
4.5	MOBILIZAÇÃO - ENTERRAMENTO DE OBRA	M2	5.574,47	369,03	23,49
4.6	MOBILIZAÇÃO - ENTERRAMENTO DE OBRA	M2	2.417,15	20,23	6,55
4.7	MOBILIZAÇÃO - ENTERRAMENTO DE OBRA	M2	10.168,20	317,39	502,63
4.8	MOBILIZAÇÃO - ENTERRAMENTO DE OBRA	M2	6.909,58	317,39	21,77
4.9	MOBILIZAÇÃO - ENTERRAMENTO DE OBRA	M2	8.977,04	1.454,95	719,10
4.10	MOBILIZAÇÃO - ENTERRAMENTO DE OBRA	M2	3.892,53	594,28	160,83
4.11	MOBILIZAÇÃO - ENTERRAMENTO DE OBRA	M2	9.439,39	18,78	8,21
4.12	MOBILIZAÇÃO - ENTERRAMENTO DE OBRA	M2	18.781,76	303,42	5,52
4.13	MOBILIZAÇÃO - ENTERRAMENTO DE OBRA	M2	1.937,51	157,72	12,73

Carlos Augusto Barbosa Gomes
Engenheiro Civil
CREA 9122 - DPA
Matrícula 0101313

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fls 1028
Rubrica



Carlos Augusto Barbosa Gomes
Engenheiro Civil
CREA 9122 - DIPA
Matrícula 0101313

5	ALVENARIA - PEDREGAL	M2	790,91	R\$	31,82	R\$	24.645,35	790,91	R\$	43,22	R\$	31,82	R\$	1.375,28
5.1	ALVENARIA EM TUDO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1,5 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	M2		R\$		25.166,76	790,91		R\$					
	MURO			R\$					R\$					
5.2	MURO EM TUDO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1,5 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM, INCLUSIVE FUNDAÇÃO E ESTRUTURA - CONTORNO DO RESERVA. ÁGUAS PLUVIAIS	M2	19,38	R\$	51,50	998,07	19,38		R\$	51,50	998,07			
6	MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS			R\$					R\$					
6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA BETUMINOSA (BUDIMAS)	M2	194,49	R\$	5,65	1.098,87	194,49		R\$	5,65	1.098,87			
6.2	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA 3MM - 1 Lajm	M2	1,60	R\$	52,39	83,82	1,60		R\$	52,39	83,82			
6.3	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 2	M2	1,60	R\$	19,00	30,40	1,60		R\$	19,00	30,40			
7	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 2	M2		R\$		15.982,33			R\$					
7.1	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 2	M2	234,35	R\$	38,42	9.003,73	234,35		R\$	38,42	9.003,73			
7.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 7CM, PREPARO MANUAL	M2	256,24	R\$	13,10	3.356,74	256,24		R\$	13,10	3.356,74			
7.3	REGULARIZAÇÃO DE PISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) GROSSA SEM PENEIRADA, ESPESURA 2CM, PREPARO MECÂNICO	M2	219,72	R\$	32,14	7.061,80	219,72		R\$	32,14	7.061,80			
7.4	PISO CALCADA EM CONCRETO (CIMENTO AREIA SEIXO ROLADO) PREPARO MECÂNICO, E ESPESURA DE 7CM (COM 40)	M2	63,76	R\$	42,40	2.703,42	63,76		R\$	42,40	2.703,42			
7.5	PAVIMENTAÇÃO EM PAVIMENTO ROLADO COM 10% DE PEDRA, INCLUSIVE DE 10 DE PEDRA - (desenho ambulatório e estacionamento - 10m)	M2	14,29	R\$	92,35	1.319,68	14,29		R\$	92,35	1.319,68			
7.6	LASTRO DE CASCALHO (estacionamento - 10m)	M2	29,90	R\$	32,12	960,39	29,90		R\$	32,12	960,39			
7.7	GRANDE DE CONCRETO	M2	11,96	R\$	38,74	462,88	11,96		R\$	38,74	462,88			
7.8	SAÍDA DE CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESURA - 8CM, LARGURA - 40CM	M2	234,35	R\$	24,34	5.704,08	234,35		R\$	24,34	5.704,08			
7.9	PISO CERAMICO 40X40CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPONI	M2	204,25	R\$	24,16	4.934,68	204,25		R\$	24,16	4.934,68			
7.10	RODAPE CERAMICO 10-10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPONI	M	27,45	R\$	49,19	1.350,27	27,45		R\$	49,19	1.350,27			
7.11	SOLERA DE GRANITO - PORTAS	M		R\$					R\$					
7.12	GRANITO EM PAREDES EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO	M2	678,77	R\$	4,63	3.142,71	678,77		R\$	4,63	3.142,71			
7.13	GRANITO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO	M2	899,04	R\$	3,60	3.236,24	899,04		R\$	3,60	3.236,24			
7.14	GRANITO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO	M2	1.577,81	R\$	20,90	32.976,23	1.577,81		R\$	20,90	32.976,23			
7.15	GRANITO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO	M2	219,18	R\$	34,08	7.468,55	219,18		R\$	34,08	7.468,55			
7.16	GRANITO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO	M2	679,86	R\$	10,04	6.825,79	679,86		R\$	10,04	6.825,79			
7.17	GRANITO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO	M2	679,86	R\$	6,62	4.490,67	679,86		R\$	6,62	4.490,67			
7.18	GRANITO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO	M2	31,75	R\$	55,60	1.766,50	31,75		R\$	55,60	1.766,50			
7.19	GRANITO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO	M2	690,13	R\$	9,55	6.590,24	690,13		R\$	9,55	6.590,24			
7.20	GRANITO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO	M2	285,93	R\$	4,63	1.323,86	285,93		R\$	4,63	1.323,86			
7.21	GRANITO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO	M2	285,93	R\$	16,66	4.763,59	285,93		R\$	16,66	4.763,59			
7.22	GRANITO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO	M2	257,40	R\$	7,86	2.023,16	257,40		R\$	7,86	2.023,16			
7.23	GRANITO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO	M2	257,40	R\$	6,62	1.703,99	257,40		R\$	6,62	1.703,99			
7.24	GRANITO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO	M2	35,21	R\$	9,55	336,26	35,21		R\$	9,55	336,26			
7.25	GRANITO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO	M2	6,68	R\$	49,70	332,09	6,68		R\$	49,70	332,09			

9.7	RELÉ FOTOELÉTRICO	UN	2,00	R\$	45,50	R\$	91,00	2,00	R\$	9,00	R\$	45,50	R\$	2,440,08
9.8	PONTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO	PT	68,00	R\$	271,12	R\$	18.436,16	68,00	R\$	9,00	R\$	271,12	R\$	-
9.9	PLACA DE SAÍDA DE FIO COM FIO CENTRAL EM CN. 4"X2" PARA PONTO DE CHUVEIRO OU AQUECEDOR	UN	2,00	R\$	2,26	R\$	4,52	2,00	R\$	14,00	R\$	2,26	R\$	246,82
9.10	TOMADA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CN. 4"X2"	UN	57,00	R\$	17,63	R\$	1.004,91	57,00	R\$	28,00	R\$	17,63	R\$	6.188,00
9.11	TOMADA 20A/127V EM CN. 10"X10" DE PRISO ALTA	UN	2,00	R\$	221,00	R\$	35,26	2,00	R\$	61,00	R\$	221,00	R\$	-
9.12	PONTO DE ENERGIA PARA TOMADA	PT	61,00	R\$	117,75	R\$	13.481,00	61,00	R\$	15,00	R\$	117,75	R\$	-
9.13	INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES EM CN. 4"X2"	UN	15,00	R\$	7,85	R\$	119,77	15,00	R\$	9,00	R\$	7,85	R\$	-
9.14	INTERRUPTOR C/ 2 TECLAS SIMPLES EM CN. 4"X2"	UN	9,00	R\$	15,53	R\$	45,20	9,00	R\$	2,00	R\$	15,53	R\$	-
9.15	INTERRUPTOR C/ 3 TECLAS SIMPLES EM CN. 4"X2"	UN	2,00	R\$	22,60	R\$	45,20	2,00	R\$	1,00	R\$	22,60	R\$	-
9.16	INTERRUPTOR C/ 4 TECLAS SIMPLES EM CN. 4"X2"	UN	1,00	R\$	12,22	R\$	24,44	1,00	R\$	2,00	R\$	12,22	R\$	-
9.17	INTERRUPTOR C/ 1 TECLA PARALELA EM CN. 4"X2"	UN	2,00	R\$	17,63	R\$	35,26	2,00	R\$	9,00	R\$	17,63	R\$	-
9.18	TOMADA DUPLA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CN. 4"X2"	UN	9,00	R\$	107,12	R\$	3.106,48	9,00	R\$	1,00	R\$	107,12	R\$	107,12
9.19	PONTO DE ENERGIA PARA INTERRUPTOR	PT	29,00	R\$	283,50	R\$	283,50	29,00	R\$	1,00	R\$	283,50	R\$	-
9.20	PANEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO INOX PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLACETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRILICO E CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO, DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.	UN	1,00	R\$	226,96	R\$	226,96	1,00	R\$	1,00	R\$	226,96	R\$	-
9.21	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A CAPAC. INTERRUPT. 25KA-CURVA C	UN	2,00	R\$	88,94	R\$	177,88	2,00	R\$	2,00	R\$	88,94	R\$	-
9.22	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100A CAPAC. INTERRUPT. 25KA-CURVA C	UN	1,00	R\$	114,74	R\$	114,74	1,00	R\$	1,00	R\$	114,74	R\$	-
9.23	PARA RAO TIPO VCL 175V 45KA	UN	2,00	R\$	283,50	R\$	567,00	2,00	R\$	2,00	R\$	283,50	R\$	-
9.24	PANEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO INOX PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLACETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRILICO E CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO, DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.	UN	2,00	R\$	167,84	R\$	335,68	2,00	R\$	4,00	R\$	167,84	R\$	335,68
9.25	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 450A SENS. 30mA (TETRAPOLAR)	UN	3,00	R\$	11,74	R\$	35,22	3,00	R\$	3,00	R\$	11,74	R\$	-
9.26	PARA RAO TIPO VCL 40KA	UN	2,00	R\$	88,94	R\$	177,88	2,00	R\$	2,00	R\$	88,94	R\$	-
9.27	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 80A CAPAC. INTERRUPT. 25KA-CURVA C	UN	10,00	R\$	8,83	R\$	88,30	10,00	R\$	10,00	R\$	8,83	R\$	-
9.28	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A	UN	10,00	R\$	13,64	R\$	136,40	10,00	R\$	10,00	R\$	13,64	R\$	-
9.29	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 15 A 50A	UN	5,00	R\$	52,61	R\$	263,05	5,00	R\$	5,00	R\$	52,61	R\$	-
9.30	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A	UN	11,00	R\$	3,17	R\$	34,87	11,00	R\$	11,00	R\$	3,17	R\$	-
9.31	PLACA AS2" COM UMA TOMADA DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6	PT	11,00	R\$	235,48	R\$	2.590,28	11,00	R\$	14,00	R\$	235,48	R\$	3.298,72
9.32	PONTO PARA INSTALAÇÃO DE LOGICA	PT	7,00	R\$	14,22	R\$	99,54	7,00	R\$	7,00	R\$	14,22	R\$	89,54
9.33	PONTO PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONIA	UN	1,00	R\$	421,20	R\$	421,20	1,00	R\$	1,00	R\$	421,20	R\$	-
9.34	RACK 10"5" TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRILICO E CHAVE FRONTAL E LATERAL COM 2 OU 4 VENTILADORES DE TIPO	UN	1,00	R\$	5,33	R\$	5,33	1,00	R\$	1,00	R\$	5,33	R\$	-
9.35	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIÁVEL	UN	2,00	R\$	10,66	R\$	21,32	2,00	R\$	2,00	R\$	10,66	R\$	-
9.36	VOZES PANEL 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIÁVEL	UN	2,00	R\$	5,33	R\$	10,66	2,00	R\$	2,00	R\$	5,33	R\$	-
9.37	PLACA SAÍDA DE FIO - 4"X2" - ANTENA DE TV	PT	2,00	R\$	133,40	R\$	266,80	2,00	R\$	1,00	R\$	133,40	R\$	-
9.38	PONTO PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TV	UN	1,00	R\$	150,13	R\$	150,13	1,00	R\$	1,00	R\$	150,13	R\$	-
9.39	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO TIPO R1 C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO E ARO	UN	3,00	R\$	450,39	R\$	1.351,17	3,00	R\$	3,00	R\$	450,39	R\$	-
9.40	TIPO COMPLETA	UN	1,00	R\$	150,13	R\$	150,13	1,00	R\$	1,00	R\$	150,13	R\$	150,13

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carvalhos
 Fls 1031
 R
 Rúbrica
 Carlos Augusto Barbosa Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA 9122 - DPA
 Matrícula 0101313

Carlos Augusto Barbosa Gomes
Engenheiro Civil
CREA 9122 - DIPA
Matrícula 0101313

10	INSTA. ACCES. HIDR. VULS. 10.1	UN	1,00	R\$	153,44	R\$	153,44	1,00	R\$	153,44	R\$	-
10.1	VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO POPULAR COM CONJUNTO PARA FNAÇÃO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA	UN	1,00	R\$	17,32	R\$	17,32	1,00	R\$	17,32	R\$	-
10.2	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR	UN	4,00	R\$	153,44	R\$	613,76	4,00	R\$	153,44	R\$	-
10.3	VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO PNE. COM CONJUNTO PARA FNAÇÃO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA INCL. ASSENTO	UN	5,00	R\$	41,48	R\$	207,40	5,00	R\$	41,48	R\$	-
10.4	PORTA PAPEL HIGIENICO ROLÃO EM PLASTICO ADES	UN	12,00	R\$	96,79	R\$	1.161,48	12,00	R\$	96,79	R\$	-
10.5	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM. PADRAO POPULAR, COM SIFÃO E ESCACAO	UN	1,00	R\$	57,14	R\$	57,14	1,00	R\$	57,14	R\$	-
10.6	LAVATORIO EM INOX PARA ESCOVAÇÃO, INCL. VALVULAS E SIFÕES, CONF. PROJETO	UN	13,00	R\$	17,92	R\$	231,66	13,00	R\$	17,92	R\$	-
10.7	PORTA SABONETE LÍQUIDO	UN	13,00	R\$	29,65	R\$	385,45	13,00	R\$	29,65	R\$	-
10.8	PORTA-TOALHA DE PAPEL	UN	1,00	R\$	157,30	R\$	157,30	1,00	R\$	157,30	R\$	-
10.9	TANQUE LOUCA, BRANCA, C/COUNA MED. ASSICROM INCL. ACESSÓRIOS DE FIN. FERRAGENS EM METAL CROMADO, TORNEIRA DE PRESSÃO 1/18 DE 1/2" VALVULA DE ESCOAMENTO 1/60 E SIFÃO 1/60 DE 1/4" X 1/2"	UN	1,00	R\$	3.151,93	R\$	3.151,93	1,00	R\$	3.151,93	R\$	1.831,89
10.10	BEBEDOURO DE PRESSÃO EM INOX	M	13,20	R\$	343,16	R\$	4.529,71	13,20	R\$	343,16	R\$	-
10.11	BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VALVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS), COMPLETA - C/TE PROJETO	M	2,70	R\$	171,60	R\$	463,32	2,70	R\$	171,60	R\$	-
10.12	BANCADA EM INOX	M	18,20	R\$	197,15	R\$	3.588,13	18,20	R\$	197,15	R\$	-
10.13	BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX	UN	1,00	R\$	-	R\$	-	1,00	R\$	-	R\$	-
10.14	ENTURBID EM INOX	UN	12,00	R\$	180,59	R\$	2.167,08	12,00	R\$	180,59	R\$	-
10.15	TORNEIRA AUTOMÁTICA CROMADA 1/2" 3/4" PARA LAVATORIO, COM ENGATE	UN	4,00	R\$	35,56	R\$	142,24	4,00	R\$	35,56	R\$	-
10.16	PLUVIAL (C/VALVULA METALICO 1/2" X 3/8")	UN	10,00	R\$	180,59	R\$	1.805,90	10,00	R\$	180,59	R\$	-
10.17	TORNEIRA AUTOMÁTICA CROMADA TUBO NOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PLAS	UN	2,00	R\$	42,31	R\$	84,74	2,00	R\$	42,31	R\$	-
10.18	CHUVEIRO ELÉTRICO COM 20 LITROS D'ÁGUA - PADRÃO PNE. REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA	UN	1,00	R\$	127,49	R\$	127,49	1,00	R\$	127,49	R\$	-
10.19	CADREIRA ESCAMOTÁVEL PARA BANHO - PADRÃO PNE. REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA	UN	1,00	R\$	1.191,24	R\$	1.191,24	1,00	R\$	1.191,24	R\$	-
10.20	RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA CILÍNDRICO CAPACIDADE 3.000L	UN	1,00	R\$	49,22	R\$	49,22	1,00	R\$	49,22	R\$	-
10.21	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 0,25MM (1 1/4")	UN	1,00	R\$	43,10	R\$	43,10	1,00	R\$	43,10	R\$	-
10.22	TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4"	UN	1,00	R\$	9,70	R\$	9,70	1,00	R\$	9,70	R\$	-
10.23	1/4" DE C/CO VALVULA 1/2" X 3/8"	UN	1,00	R\$	493,50	R\$	493,50	1,00	R\$	493,50	R\$	-
10.24	FILTRO VOLUMETRICO MODELO VPI	UN	1,00	R\$	17,00	R\$	17,00	1,00	R\$	17,00	R\$	-
10.25	FREIO D'ÁGUA 0100	UN	1,00	R\$	16,34	R\$	16,34	1,00	R\$	16,34	R\$	-
10.26	SIFÃO LADRÃO 0100	UN	1,00	R\$	93,70	R\$	93,70	1,00	R\$	93,70	R\$	-
10.27	SISTEMA AUTOMÁTICO DE REALIMENTAÇÃO 3/4" CONTENDO BOIA AUTOMÁTICA DE NÍVEL E VALVULA SOLENOIDE	UN	1,00	R\$	93,70	R\$	93,70	1,00	R\$	93,70	R\$	-
10.28	BOIA AUTOMÁTICA DE NÍVEL	UN	1,00	R\$	53,00	R\$	53,00	1,00	R\$	53,00	R\$	-
10.29	CONJUNTO FLUTUANTE DE SUÇÃO 0 1"	UN	1,00	R\$	255,00	R\$	255,00	1,00	R\$	255,00	R\$	-
10.30	PRESSURIZADOR (SILENCIOSO) AUTOMÁTICO COM PRESSOSTATO, POTENCIA 0,5HP - 19mca 2.000 lb	UN	1,00	R\$	52,16	R\$	52,16	1,00	R\$	52,16	R\$	-
10.31	REGISTRO GAVETA 1 1/4" BRUTO LATÃO - FORNEC. E INSTALACAO	UN	1,00	R\$	29,10	R\$	29,10	1,00	R\$	29,10	R\$	-
10.32	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATÃO - FORNEC. E INSTALACAO	UN	1,00	R\$	36,65	R\$	36,65	1,00	R\$	36,65	R\$	-
10.33	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATÃO - FORNEC. E INSTALACAO METAIS. ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS	UN	1,00	R\$	48,79	R\$	48,79	1,00	R\$	48,79	R\$	-
10.34	REGISTRO PRESSÃO 3/4" COM CANOPLA, ACABAMENTO CROMADO SIMPLES	UN	2,00	R\$	187,50	R\$	375,00	2,00	R\$	187,50	R\$	-
10.35	VALVULA DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO	UN	6,00	R\$	187,50	R\$	1.125,00	6,00	R\$	187,50	R\$	272,80
10.36	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA, ACABAMENTO CROMADO SIMPLES	UN	16,00	R\$	54,50	R\$	872,00	16,00	R\$	54,50	R\$	-
10.37	RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA CILÍNDRICO, CAPACIDADE 5.000L	UN	2,00	R\$	390,00	R\$	780,00	2,00	R\$	390,00	R\$	-
10.38	TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4"	UN	1,00	R\$	43,10	R\$	43,10	1,00	R\$	43,10	R\$	-
10.39	LEVITADOR DE C/CO GALVANIZADO 3/4"	UN	1,00	R\$	9,70	R\$	9,70	1,00	R\$	9,70	R\$	-
10.40	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATÃO - FORNEC. E INSTALACAO	UN	2,00	R\$	29,10	R\$	58,20	2,00	R\$	29,10	R\$	-
10.41	CANOA SIFONADA PVC COM GRELHA	UN	9,00	R\$	29,33	R\$	263,97	9,00	R\$	29,33	R\$	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS
TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: R A CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - EPP
CNPJ: 10.576.869/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 19:19:00 do dia 26/06/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/12/2017.

Código de controle da certidão: **F37E.840E.947F.3DA7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** R A CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - EPP**Inscrição Estadual:** 15.281.710-7**CNPJ:** 10.576.869/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 18:11:17 do dia 23/06/2017**Válida até:** 20/12/2017**Número da Certidão:** 702017080313764-3**Código de Controle de Autenticidade:** 98D41A69.9401FC1A.ED776708.13A0DC19**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

4

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** R A CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - EPP**Inscrição Estadual:** 15.281.710-7**CNPJ:** 10.576.869/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 18:11:17 do dia 23/06/2017**Válida até:** 20/12/2017**Número da Certidão:** 702017080313763-5**Código de Controle de Autenticidade:** 68F59DB8.460536A6.4727D694.96B37AFB**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

02/07/2017

Certidão de Débitos



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO - (04) 3424-2248 / 3424-8486

DATA DE EMISSÃO: 02/07/2017

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO**
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAPARA VALIDAÇÃO DESTE DOCUMENTO ACESSE O SITE
PREFEITURAMODERNA.COM.BR. ESCOLHA SUA PREFEITURA.
ACESSE A VALIDAÇÃO E INFORME O Nº DA CERTIDÃO.**CERTIDÃO NEGATIVA****Nº 0026719****Informações do Contribuinte**CÓDIGO CMC TÍTULO ESTABELECIMENTO
33005 R A CONSTRUÇÃO E SERVICOS LTDACPF / CNPJ
10.576.869/0001-32**Endereço do Contribuinte**ENDEREÇO
RUA RIO MARIANÚMERO
300NÚMERO CEP MUNICÍPIO - UF
68550545 REDENÇÃO - PA

NOME EDIFÍCIO

APTO / SALA

Informações do RequerenteNº DE DOCUMENTO NOME DO REQUERENTE
10567869000132 R A Construção e ServiçosFINALIDADE
licitação/acompanhamentoOBSERVAÇÕES
licitação/acompanhamento**Data de Emissão: 02/07/2017****Data de Validade: 01/08/2017**

De acordo com a Lei Complementar Municipal nº. 033 de 23 de dezembro de 2003, que institui o Código Tributário deste Município, CERTIFICA-SE QUE, revendo os lançamentos desta Prefeitura, o contribuinte acima descrito, **NADA DEVE** à Fazenda Municipal, referente a Impostos, Taxas ou Multas, até a presente data, ressalvado o direito do FISCO MUNICIPAL, quanto a qualquer débito que venha a ser apurado.

mais havendo, o referido é verdade do que dou fé

REDENÇÃO-PA

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10576869/0001-32
Razão Social: RA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: FLORIDA CONSTRUTORA
Endereço: AV WILMA GUIMARAES PENNA S/N / PARK DOS BURITIS / REDENCAO / PA / 68552-765

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/07/2017 a 12/08/2017

Certificação Número: 2017071402281949319771

Informação obtida em 31/07/2017, às 08:31:48.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R A CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.576.869/0001-32

Certidão nº: 131522234/2017

Expedição: 23/06/2017, às 18:50:27

Validade: 19/12/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que R A CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.576.869/0001-32, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.


INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



TERMO DE AUTORIZAÇÃO

Em uso das atribuições com a Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás/PA, na qualidade de Secretaria Municipal, autorizo a Comissão Permanente de Licitação/CPL proceder o aditivo ao contrato nº 20141120 que tem como objetivo a contratação de empresa para execução de obra de uma unidade de saúde da família localizada na Rua Cumaru, Centro, zona urbana do município de Canaã dos Carajás - PA, a ser regido pela Lei N.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, alterada pelas Leis N.º 8.883/94, de 08 de junho de 1994 e Lei N.º 9.648/98, de 28 de maio de 1998.



Jeová Gonçalves de Andrade
Prefeito Municipal



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



SÉTIMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20141120

O Município de CANAÃ DOS CARAJÁS, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 11.903.351/0001-29, com sede na Rua Tancredo Neves S/N, representado por DINILSON JOSE DOS SANTOS, na qualidade de ordenador(a) de despesas, doravante denominado(a) CONTRATANTE, e R A CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP, inscrito(a) no CNPJ 10.576.869/0001-32, com sede na RUA RIO MARIA N300, MORADA DA PAZ, Redenção do Pará-PA, CEP 68552-765, representada por ADAILTON GOMES TEIXEIRA, já qualificados no contrato inicial, determinaram por meio deste, alterar o referido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

presente Termo Aditivo objetiva a alteração contratual no valor de R\$ 65.902,05 (sessenta e cinco mil, novecentos e dois reais e cinco centavos), nos termos do art. 65, inciso I, alínea 'b', e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, passando o Contrato a ter o valor total de R\$ 473.294,03 (quatrocentos e setenta e três mil, duzentos e noventa e quatro reais e três centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: Exercício 2017 Projeto 1319.103011333.1.043 Construir unidades de saúde da família, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e Instalações, Subelemento 4.4.90.51.99, no valor de R\$ 65.902,05. Fonte de Recurso 010000.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de sua publicação.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.

CANAÃ DOS CARAJÁS - PA, 31 de Julho de 2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ(MF) 11.903.351/0001-29
CONTRATANTE

R A CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ 10.576.869/0001-32
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. _____

2. _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ
