**SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 111.2017.20.3.002**

**SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE TUCURUÍ - PREFEITURA MUNICIPAL E A EMPRESA INOVE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, PARA O FIM QUE NELE DECLARA.**

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE TUCURUÍ - PREFEITURA MUNICIPAL**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 05.251.632/0001-41, com sede à Rua Raimundo Ribeiro de Souza nº 01, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **ARTUR DE JESUS BRITO**, brasileiro, administrador, portador da Cédula de Identidade nº 4115776 SSP/PA, inscrito no CPF/MF nº 513.664.792-20, residente e domiciliado na Rua Rondônia, nº 08, Vila Permanente, doravante denominado CONTRATANTE, de outro lado a empresa **INOVE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP,** sito à Avenida Benevides, nº 80, Jardim São Francisco ds Chagas, CEP 68.459-230, Tucuruí/PA, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.192.555/0001-85, Inscrição Estadual nº 15.401.287-4, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por **EVERALDO PINTO RODRIGUES**, brasileiro, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 04560613595 DETRAN/PA e do CPF nº 334.413.082-04, residente e domiciliado à Alameda A, nº 281, COHAB, Tucuruí /PA, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato, considerando a homologação do resultado obtido através da Licitação na modalidade **Tomada de Preços nº TP-CPL-002/2017-PMT** e os termos da Proposta vencedora e a legislação vigente, principalmente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Contrato, mediante as seguintes Cláusulas e condições

**CLÁUSULA I – DA PRORROGAÇÃO**

Considerando o período de chuvas em nossa região, o mesmo ocasionou um atraso na execução dos serviços o que prejudicou o cronograma de execução da obra, conforme justificativa do Secretário de Obras do Município, mister se faz o presente aditamento ao contrato mantido entre as partes acima identificadas visando, desta forma, restabelecer-se a relação pactuada para prestação dos serviços, ficando o contrato prorrogado por mais **quatro (04) meses**, com **início no dia 03.06.2018 e término em 03.10.2018**, certo de que o prazo ora estabelecido poderá ser antecipado, a critério único e exclusivo da CONTRATANTE.

**CLÁUSULA II – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

As despesas decorrentes da presente licitação terão cobertura da seguinte dotação orçamentária prevista no orçamento fiscal vigente:

**ÓRGÃO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ**
**UNID. EXEC. 02.10-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO**
**15.451.0012-1.011- CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS**
**4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES**
**FONTE: 1001 – RECURSOS ORDINÁRIOS**

**Parágrafo único:** A dotação orçamentária que trata o CLÁUSULA II, poderá ser alterada através de Termo de Apostilamento, no caso de modificação na estrutura administrativa do Município de Tucuruí.

**CLÁUSULA III – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL**

O presente instrumento constitui parte integrante do **Contrato nº 111.2017.20.3.002**, originário do **Tomada de Preços nº TP-CPL-002/2017-PMT**, devidamente homologado, referente a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DA PRAÇA DAS BANDEIRAS, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA ISABEL, CIDADE DE TUCURUÍ-PA**, celebrado em 02 de outubro de 2017, cujas cláusulas e condições, no que não conflitarem com as disposições estabelecidas neste Termo de Aditivo, são expressamente ratificadas pelas partes, continuando em pleno vigor para todos os fins de direito.

**CLÁUSULA IV**

Permanecem inalteradas e ratificadas as Cláusulas e condições do Contrato firmado, especialmente no tocante a manutenção dos preços então contratados, desde que não revogadas ou derrogadas até a presente data.

**CLÁUSULA V – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

A presente prorrogação é feita com base no art. 57, II, § 2º da Lei nº 8.666/93, permanecendo inalteradas as demais cláusulas do Contrato Original.

E assim, por estarem justas e contratadas as partes assinam o presente aditivo em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

**DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ, ESTADO DO PARÁ, AOS VINTE E OITO DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO.

**MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PREFEITURA MUNICIPAL**
**ARTUR DE JESUS BRITO**
**PREFEITO MUNICIPAL**
**CONTRATANTE**

Assinado de forma digital por ARTUR DE JESUS BRITO:51366479220
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=Certificado PF A3, cn=ARTUR DE JESUS BRITO:51366479220
Dados: 2018.05.28 10:29:50 -03'00'

**INOVE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**
**CONTRATADA**
**EVERALDO PINTO RODRIGUES**
**REPRESENTANTE**

Assinado de forma digital por INOVE SERVICOS E CONTRUCOES EIRELI - EPP:17192555000185
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=Certificado PJ A1, cn=INOVE SERVICOS E CONTRUCOES EIRELI - EPP:17192555000185
Dados: 2018.05.28 12:11:26 -03'00'

TESTEMUNHAS:

_____
C.P.F

_____
C.P.F

Este SEGUNDO TERMO DE ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 111.2017.20.3.002**,** foi publicado no quadro de aviso desta Prefeitura, conforme expressa a Lei Municipal nº 3.896 de 26 de setembro de 1994, na data supra.

**WILSON WISCHANSKY**
Chefe de Gabinete
Portaria Nº 556/2017-GP

PREFEITURA DE TUCURUÍ
CIDADE MELHOR, A GENTE QUE FAZ!

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO**

**PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS**

**REFORMA DA PRAÇA DAS BANDEIRAS**
**CONTRATO Nº 111.2017.20.3.002 - TP- CPL - 002/2017**

**2ª Termo Aditivo - Saldo Acumulado**

**Empresa: Inove Serviços e Construções Eireli - Epp**

**Data: 21/05/2018**

| Item | Sinapi/Sedop | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | Preço (R$) | | Acumulado | | | Saldo Contratual (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Unitário | Total | Execução (%) | Físico | Financeiro (R$) | |
| **1 - SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | SEDOP 010005 | Fornecimento e execução de barracão da obra em madeira para almoxarifado/depósito com piso cimentado | m² | 12,00 | R$ 271,18 | R$ 3.254,16 | 100,00% | 12,00 | R$ 3.254,16 | R$ - |
| 1.2 | Composição | Instalação provisória de água e esgoto para obra | unid | 1,00 | R$ 1.223,05 | R$ 1.223,05 | 100,00% | 1,00 | R$ 1.223,05 | R$ - |
| 1.3 | Composição | Instalação provisória de luz e força para obra | unid | 1,00 | R$ 1.014,43 | R$ 1.014,43 | 100,00% | 1,00 | R$ 1.014,43 | R$ - |
| 1.4 | 74209/001 | Placa indicativa da obra, confeccionada em estrutura de madeira de lei e revestida com chapas de aço galvanizado e pintadas conforme padronização da Contratada com dimensões 200x180 cm | m² | 3,60 | R$ 487,10 | R$ 1.753,56 | 100,00% | 3,60 | R$ 1.753,56 | R$ - |
| 1.5 | Composição | Fornecimento e execução de tapume de chapa de madeira compensada, e=4 mm (h=2,20 m) | m² | 288,09 | R$ 35,09 | R$ 10.109,08 | 100,00% | 288,09 | R$ 10.109,08 | R$ - |
| | | **TOTAL DO ITEM 1** | | | | **R$ 17.354,28** | | | **R$ 17.354,28** | **R$ -** |
| **2 - DEMOLIÇÕES, RECUPERAÇÕES E RETIRADAS** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | 85336 | Remoção de hastes metálicas das lixeiras | m | 6,00 | R$ 4,67 | R$ 28,02 | 100,00% | 6,00 | R$ 28,02 | R$ - |
| 2.2 | 73948/002 | Raspagem e limpeza das estátuas gerais e suas bases para recebimento de nova pintura | m² | 2,34 | R$ 7,37 | R$ 17,25 | 50,00% | 1,17 | R$ 8,62 | R$ 8,63 |
| 2.3 | 73948/002 | Raspagem e limpeza das estátuas de leões e suas bases para recebimento de nova pintura | m² | 3,69 | R$ 7,37 | R$ 27,20 | 49,86% | 1,84 | R$ 13,56 | R$ 13,64 |
| 2.4 | 73948/002 | Raspagem e limpeza da mureta de medição de energia para recebimento de nova pintura | m² | 10,15 | R$ 7,37 | R$ 74,81 | 50,05% | 5,08 | R$ 37,44 | R$ 37,37 |
| 2.5 | 85335 | Demolição de meio fio dos canteiros com empilhamento | m | 361,98 | R$ 6,88 | R$ 2.490,42 | 100,00% | 361,98 | R$ 2.490,42 | R$ - |
| 2.6 | Composição | Recuperação de meio fio, incluindo revestimento com chapisco e reboco | m | 183,91 | R$ 28,41 | R$ 5.224,88 | 64,00% | 117,70 | R$ 3.343,86 | R$ 1.881,02 |
| 2.7 | SEDOP 20018 | Demolição de piso em concreto (camada regularizadora, e= 3 cm), inclusive rampas | m³ | 38,13 | R$ 206,57 | R$ 7.876,51 | 59,98% | 22,87 | R$ 4.724,25 | R$ 3.152,26 |
| 2.8 | Composição | Recuperação de caixas de passagem em concreto | unid | 15,00 | R$ 30,89 | R$ 463,35 | 0,00% | 0,00 | R$ - | R$ 463,35 |
| 2.9 | SEDOP 20018 | Demolição de bancos de concreto | m³ | 13,42 | R$ 31,78 | R$ 426,49 | 100,00% | 13,42 | R$ 426,49 | R$ - |
| 2.10 | 73859/002 | Remoção de grama dos canteiros, inclusive material inservível | m² | 969,44 | R$ 1,13 | R$ 1.095,47 | 90,00% | 872,49 | R$ 985,91 | R$ 109,56 |
| 2.11 | 72898+72900 | Carga e descarga mecanizada em caminhão basculante com transporte para remoção de entulho para bota-fora | m³ | 332,33 | R$ 10,85 | R$ 3.605,78 | 48,14% | 160,00 | R$ 1.736,00 | R$ 1.869,78 |
| 2.12 | SEDOP 020677 | Execução de retirada de pintura com escova de aço em muro, inclusive mureta de energia | m² | 351,19 | R$ 4,99 | R$ 1.752,44 | 0,00% | 0,00 | R$ - | R$ 1.752,44 |
| 2.13 | SEDOP 020677 | Execução de retirada de pintura com escova de aço em postes e mastros de bandeiras. | m² | 138,00 | R$ 4,99 | R$ 688,62 | 0,00% | 0,00 | R$ - | R$ 688,62 |
| | | **TOTAL DO ITEM 2** | | | | **R$ 23.771,24** | | | **R$ 13.794,57** | **R$ 9.976,67** |
| **3 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Composição | Fornecimento e instalação de poste em tubo de aço galvanizado de 4", com 6 m, inclusive chumbador de aço e base em concreto para fixação | un | 1,00 | R$ 1.493,38 | R$ 1.493,38 | 0,00% | 0,00 | R$ - | R$ 1.493,38 |
| 3.2 | 72278 | Fornecimento e instalação de lâmpada de vapor metálico 250 W | un | 18,00 | R$ 65,32 | R$ 1.175,76 | 0,00% | 0,00 | R$ - | R$ 1.175,76 |
| 3.3 | Composição | Fornecimento e instalação de reator 250W | un | 18,00 | R$ 83,98 | R$ 1.511,64 | 0,00% | 0,00 | R$ - | R$ 1.511,64 |
| 3.4 | Composição | Fornecimento e instalação de relé fotoelétrico 220V - 1200W | un | 18,00 | R$ 24,66 | R$ 443,88 | 0,00% | 0,00 | R$ - | R$ 443,88 |
| 3.5 | SEDOP 171144 | Fornecimento e instalação de base relé fotoelétrico | un | 18,00 | R$ 9,03 | R$ 162,54 | 0,00% | 0,00 | R$ - | R$ 162,54 |
| 3.6 | Composição | Execução de retirada e reinstalação de postes de aço, inclusive base em concreto para fixação | un | 2,00 | R$ 31,78 | R$ 63,56 | 0,00% | 0,00 | R$ - | R$ 63,56 |
| 3.7 | Composição | Revisão em todas as instalações elétricas da praça com substituição dos itens necessários | un | 1,00 | R$ 2.077,58 | R$ 2.077,58 | 0,00% | 0,00 | R$ - | R$ 2.077,58 |
| 3.8 | 83447 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem com tampa ( 400 x 400 x 500 mm) | un | 2,00 | R$ 209,33 | R$ 418,66 | 0,00% | 0,00 | R$ - | R$ 418,66 |
| 3.9 | SEDOP 090822 | Fornecimento e instalação de portão em grade de metalon, incluso uma demão de fundo anticorrosivo, para mureta de medição de energia (1,00 m x 1,10 m), inclusive cadeado | m² | 1,10 | R$ 320,10 | R$ 352,11 | 0,00% | 0,00 | R$ - | R$ 352,11 |
| | | **TOTAL DO ITEM 3** | | | | **R$ 7.699,11** | | | **R$ -** | **R$ 7.699,11** |
| **4 - URBANIZAÇÃO** | | | | | | | | | | |

PREFEITURA DE TUCURUÍ
CIDADE MELHOR, A GENTE QUE FAZ!

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

REFORMA DA PRAÇA DAS BANDEIRAS
CONTRATO Nº 111.2017.20.3.002 - TP- CPL - 002/2017

2ª Termo Aditivo - Saldo Acumulado

Empresa: Inove Serviços e Construções Eireli - Epp

Data: 21/05/2018

| Item | Sinapi/Sedop | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | Preço (R$) | | Acumulado | | | Saldo Contratual (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Unitário | Total | Execução (%) | Físico | Financeiro (R$) | |
| 4.1 | 85180 | Fornecimento e plantio de grama esmeralda em todos os canteiros da praça, exceto os 04 canteiros das estátuas da frente | m² | 969,44 | R$ 17,29 | R$ 16.761,62 | 0,00% | 0,00 | R$ - | R$ 16.761,62 |
| 4.2 | 73859/002 | Execução de roço e limpeza manual em áreas gramadas (nos canteiros das estátuas - frente) | m² | 356,18 | R$ 1,13 | R$ 402,48 | 0,00% | 0,00 | R$ - | R$ 402,48 |
| 4.3 | Composição | Fornecimento e execução de bancos em concreto polido (dim=0,6x3,00m), inclusive pintura com resina acrílica, duas demãos | un | 12,00 | R$ 260,61 | R$ 3.127,32 | 0,00% | 0,00 | R$ - | R$ 3.127,32 |
| 4.4 | Composição | Fornecimento e instalação de lixeiras seletivas, inclusive chumbamento | un | 6,00 | R$ 460,53 | R$ 2.763,18 | 0,00% | 0,00 | R$ - | R$ 2.763,18 |
| 4.5 | Composição | Fornecimento e instalação de tampas de concreto com puxador para caixas de passagem | un | 15,00 | R$ 24,21 | R$ 363,15 | 0,00% | 0,00 | R$ - | R$ 363,15 |
| 4.6 | Composição | Fornecimento e instalação de tubos em aço galvanizado Ø 4", comprimento de 3,20 m, para postes da rede de vôlei | un | 2,00 | R$ 2.845,09 | R$ 5.690,18 | 0,00% | 0,00 | R$ - | R$ 5.690,18 |
| 4.7 | SEDOP 130728 | Fornecimento e assentamento de piso tátil direcional e de alerta em concreto, pintado nas cores amarelo e vermelho, respectivamente, conforme demarcações em projeto | m² | 74,19 | R$ 138,18 | R$ 10.251,57 | 0,00% | 0,00 | R$ - | R$ 10.251,57 |
| 4.8 | Composição | Fornecimento e execução de piso em concreto, fck 20 MPa, espessura 3 cm, com juntas de dilatação plástica, inclusive rampas | m² | 1.227,30 | R$ 43,01 | R$ 52.786,17 | 11,00% | 135,00 | R$ 5.806,35 | R$ 46.979,82 |
| 4.9 | SEDOP 260519 | Fornecimento e execução de meio fio em concreto, em canteiros (nas áreas dos bancos) | m | 176,72 | R$ 26,78 | R$ 4.732,56 | 100,00% | 176,72 | R$ 4.732,56 | R$ - |
| 4.10 | 73806/001 | Execução de limpeza de superfícies para recebimento de nova pintura, com jato de alta pressão de ar e água (meio fio em canteiros e calçadas, placas de concreto/meio fio do canteiro central, caixas de passagem onde receberão nova pintura) | m² | 371,74 | 1,46 | R$ 542,74 | 0,00% | 0,00 | R$ - | R$ 542,74 |
| **TOTAL DO ITEM 4** | | | | | | **R$ 97.420,97** | | | **R$ 10.538,91** | **R$ 86.882,06** |
| **5 - PINTURA** | | | | | | | | | | |
| 5.1 | 88485 | Fornecimento e aplicação de fundo selador acrílico no muro, nas bases dos monumentos simbólicos e em mureta de medição de energia, uma demão | m² | 358,49 | R$ 2,03 | R$ 727,73 | 0,00% | 0,00 | R$ - | R$ 727,73 |
| 5.2 | 88497 | Lixamento e emassamento com massa acrílica no muro, nas bases dos monumentos simbólicos e em mureta de medição de energia, duas demãos | m² | 358,49 | R$ 9,88 | R$ 3.541,88 | 0,00% | 0,00 | R$ - | R$ 3.541,88 |
| 5.3 | 88489 | Fornecimento e aplicação de pintura com tinta látex acrílica semibrilho (fab. Coral ou similar) na cor branco gelo no muro, duas demãos | m² | 341,04 | R$ 17,01 | R$ 5.801,09 | 0,00% | 0,00 | R$ - | R$ 5.801,09 |
| 5.4 | 74245/001 | Fornecimento e execução de pintura com tinta acrílica premium em piso cimentado na cor cinza chumbo, nova cor , duas demãos, inclusive caixas de passagem com tampas e placas de concreto do canteiro central | m² | 1.260,34 | R$ 12,58 | R$ 15.855,08 | 0,00% | 0,00 | R$ - | R$ 15.855,08 |
| 5.5 | 74245/001 | Fornecimento e execução de pintura com tinta acrílica premium nova cor, na cor branco neve, para meio fio em canteiros e calçadas, duas demãos | m² | 434,36 | R$ 12,58 | R$ 5.464,25 | 0,00% | 0,00 | R$ - | R$ 5.464,25 |
| 5.6 | 73924/002 | Fornecimento e execução de pintura esmalte sintético (fab. Coral ou similar), acabamento acetinado, na cor branco neve, duas demãos em monumentos simbólicos | m² | 9,06 | R$ 21,05 | R$ 190,71 | 0,00% | 0,00 | R$ - | R$ 190,71 |
| 5.7 | Composição | Fornecimento e aplicação de pintura com tinta acrílica com acabamento fosco da linha econômica na cor Oceano (fab. Coral ou similar), três demãos, inclusive duas demãos de resina acrílica, nas bases dos monumentos simbólicos e na mureta de energia | m² | 17,45 | R$ 25,88 | R$ 451,61 | 0,00% | 0,00 | R$ - | R$ 451,61 |
| 5.8 | 74245/001 | Fornecimento e execução de pintura acrílica premium nova cor, na cor azul, em rampas de acesso, duas demãos | m² | 8,50 | R$ 12,58 | R$ 106,93 | 0,00% | 0,00 | R$ - | R$ 106,93 |
| 5.9 | 84665 | Fornecimento e execução de pintura acrílica premium nova cor, na cor branco neve, para sinalização horizontal de pictograma em rampas de acesso | m² | 0,40 | R$ 18,50 | R$ 7,40 | 0,00% | 0,00 | R$ - | R$ 7,40 |
| 5.10 | 79500/002 | Fornecimento e execução de pintura com tinta acrílica premium, nova cor, conforme cores definidas em projeto (duas cores), para quadra de vôlei, três demãos | m² | 240,00 | R$ 17,72 | R$ 4.252,80 | 0,00% | 0,00 | R$ - | R$ 4.252,80 |
| 5.11 | 41595 | Fornecimento e execução de pintura acrílica nova cor de faixas de demarcação em quadra de vôlei, 5 cm de largura, na cor branco. | m | 136,00 | R$ 9,48 | R$ 1.289,28 | 0,00% | 0,00 | R$ - | R$ 1.289,28 |
| 5.12 | 84665 | Fornecimento e execução de pintura acrílica premium, na cor amarelo demarcação, nova cor para demarcação horizontal de vagas de estacionamento, espessura 10 cm | m² | 13,13 | R$ 18,50 | R$ 242,91 | 0,00% | 0,00 | R$ - | R$ 242,91 |
| 5.13 | 74145/001 | Fornecimento e execução de pintura esmalte sintético (fab. Coral ou similar), acabamento semi-brilho, cor branco neve, utilizando revolver/compressor, duas demãos, incluso uma demão de fundo anticorrosivo, nos mastros, postes de vôlei e portão | m² | 125,63 | R$ 12,58 | R$ 1.580,43 | 0,00% | 0,00 | R$ - | R$ 1.580,43 |

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

REFORMA DA PRAÇA DAS BANDEIRAS
CONTRATO Nº 111.2017.20.3.002 - TP- CPL - 002/2017

2ª Termo Aditivo - Saldo Acumulado

Empresa: Inove Serviços e Construções Eireli - Epp

Data: 21/05/2018

| Item | Sinapi/Sedop | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | Preço (R$) | | Acumulado | | | Saldo Contratual (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Unitário | Total | Execução (%) | Físico | Financeiro (R$) | |
| 5.14 | Composição | Fornecimento e aplicação de pintura automotiva na cor cinza chassis (fab. rural ou similar), duas demãos, incluso uma demão de fundo anticorrosivo em postes elétricos | m² | 16,96 | R$ 28,87 | R$ 489,64 | 0,00% | 0,00 | R$ - | R$ 489,64 |
| 5.15 | Composição | Fornecimento e aplicação de pintura com tinta automotiva para 02 braços de luminárias, inclusive as luminárias na cor azul sint (ref. 5497 5036), duas demãos e uma demão de fundo anticorrosivo - unidade | m² | 13,25 | R$ 28,87 | R$ 382,53 | 0,00% | 0,00 | R$ - | R$ 382,53 |
| **TOTAL DO ITEM 5** | | | | | | **R$ 40.384,27** | | | **R$ -** | **R$ 40.384,27** |
| **6 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES** | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Composição | Locação de andaime metálico tubular tipo torre (h=6,00m), para os serviços de pintura dos postes e manutenção das luminárias. | Dias | 12,00 | R$ 30,80 | R$ 369,60 | 0,00% | 0,00 | R$ - | R$ 369,60 |
| 6.2 | Composição | Fornecimento e instalação de placa de inauguração da obra em metal, dim = 40x60 cm | un | 1,00 | R$ 2.422,29 | R$ 2.422,29 | 0,00% | 0,00 | R$ - | R$ 2.422,29 |
| 6.3 | 9537 | Execução da limpeza final da obra com retirada de entulho para bota fora | m² | 2463,09 | R$ 2,52 | R$ 6.206,99 | 0,00% | 0,00 | R$ - | R$ 6.206,99 |
| **TOTAL DO ITEM 6** | | | | | | **R$ 8.998,88** | | | **R$ -** | **R$ 8.998,88** |
| **TOTAL GERAL DA PLANILHA** | | | | | | **R$ 195.628,75** | **21,31%** | | **R$ 41.687,76** | **R$ 153.940,99** |

**Florivaldo Vieira Martins**
Secretário Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação.
Engenheiro Civil RN: 151.226.229-9
Portaria nº 542/2017 - GP

**Raimundo Nonato Dutra Duarte**
Secretário Municipal Adjunto de Obras, Serviços Urbanos e Habitação
Engenheiro Civil - CREAPA 150.180.722-6
Portaria nº 733/2018 - GP

PREFEITURA DE TUCURUÍ
CIDADE MELHOR, A GENTE QUE FAZ!

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO**

**REFORMA DA PRAÇA DAS BANDEIRAS**
**CONTRATO Nº 111.2017.20.3.002 - TP- CPL - 002/2017**

## *CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO*

| ITEM | PERIODO DE EXECUÇÃO | | 1º Mês | | | | 2º Mês | | | | 3º Mês | | | | 4º Mês | | | | % da Obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | R$ | Semanas | | | | Semanas | | | | Semanas | | | | Semanas | | | | |
| | | | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | 0,00% |
| 2 | DEMOLIÇÕES, RECUPERAÇÕES E RETIRADAS | 9.976,67 | 49,98% | | | 4.986,34 | 50,02% | | | 4.990,33 | | | | - | | | | - | 6,48% |
| 3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 7.699,11 | | | | - | 38,32% | | | 2.950,30 | | | | - | 61,68% | | | 4.748,81 | 5,00% |
| 4 | URBANIZAÇÃO | 86.882,06 | | | | - | 31,00% | | | 26.933,44 | 69,00% | | | 59.948,62 | | | | - | 56,44% |
| 5 | PINTURA | 40.384,27 | | | | - | | | | - | 25,00% | | | 10.096,07 | 75,00% | | | 30.288,20 | 26,23% |
| 6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 8.998,88 | | | | - | | | | - | | | | - | 100,00% | | | 8.998,88 | 5,85% |
| VALOR DO CRONOGRAMA R$ | | 153.940,99 | R$ | | | 4.986,34 | R$ | | | 34.874,07 | R$ | | | 70.044,69 | R$ | | | 44.035,89 | 100% |
| PERCENTUAL MENSAL | | 100,00% | 3,24% | | | | 22,65% | | | | 45,50% | | | | 28,61% | | | | 100% |

**Florivaldo Vieira Martins**
Secretário Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação.
Engenheiro Civil RN: 151.226.229-9
Portaria nº 542/2017 - GP

**Raimundo Nonato Dutra Duarte**
Secretário Municipal Adjunto de Obras, Serviços Urbanos e Habitação
Engenheiro Civil - CREAPA 150.180.722-6
Portaria nº 733/2018 - GP

# JUSTIFICATIVA

O contrato nº 111.2017.20.3.002 que tem como objeto os Serviços de Reforma da Praça das Bandeiras tem como motivo a prorrogação do 2º termo aditivo de prazo de vigência ao contrato administrativo.

O supracitado contrato tem seu prazo de vigência até 02/06/2018, porém o mesmo está em execução de suas etapas para seguir suas metas de acordo com o contrato firmado. Seu prazo de execução precisa ser aditivado, pois ocorreu atraso na transferência de recurso e a empresa diminuiu sua produção prejudicando o andamento da obra. Com isso, ocorreram atividades de execuções de demolições de piso de concreto com o uso de rompedor pela resistência do piso o que levou vários dias, execução de piso em concreto com juntas de dilatação plástica e bancos de concreto polido.

Portanto, o período de chuva na região dificultou o avanço da obra que afetou consideravelmente o cronograma, tendo em vista, que alguns serviços ficaram impossibilitados de serem iniciados.

Assim, é de suma importância o acréscimo de Prazo de Vigência e Execução para que se mantenha a entrega do objeto licitado dentro do cronograma previsto, prorrogando sua vigência e execução por 04 meses.

Tucuruí, Pará 21 de maio de 2018.

**Florivaldo Vieira Martins**
Secretário Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação
Eng. Civil - RN: 151.226.209-9
Portaria nº 542/2017 - GP

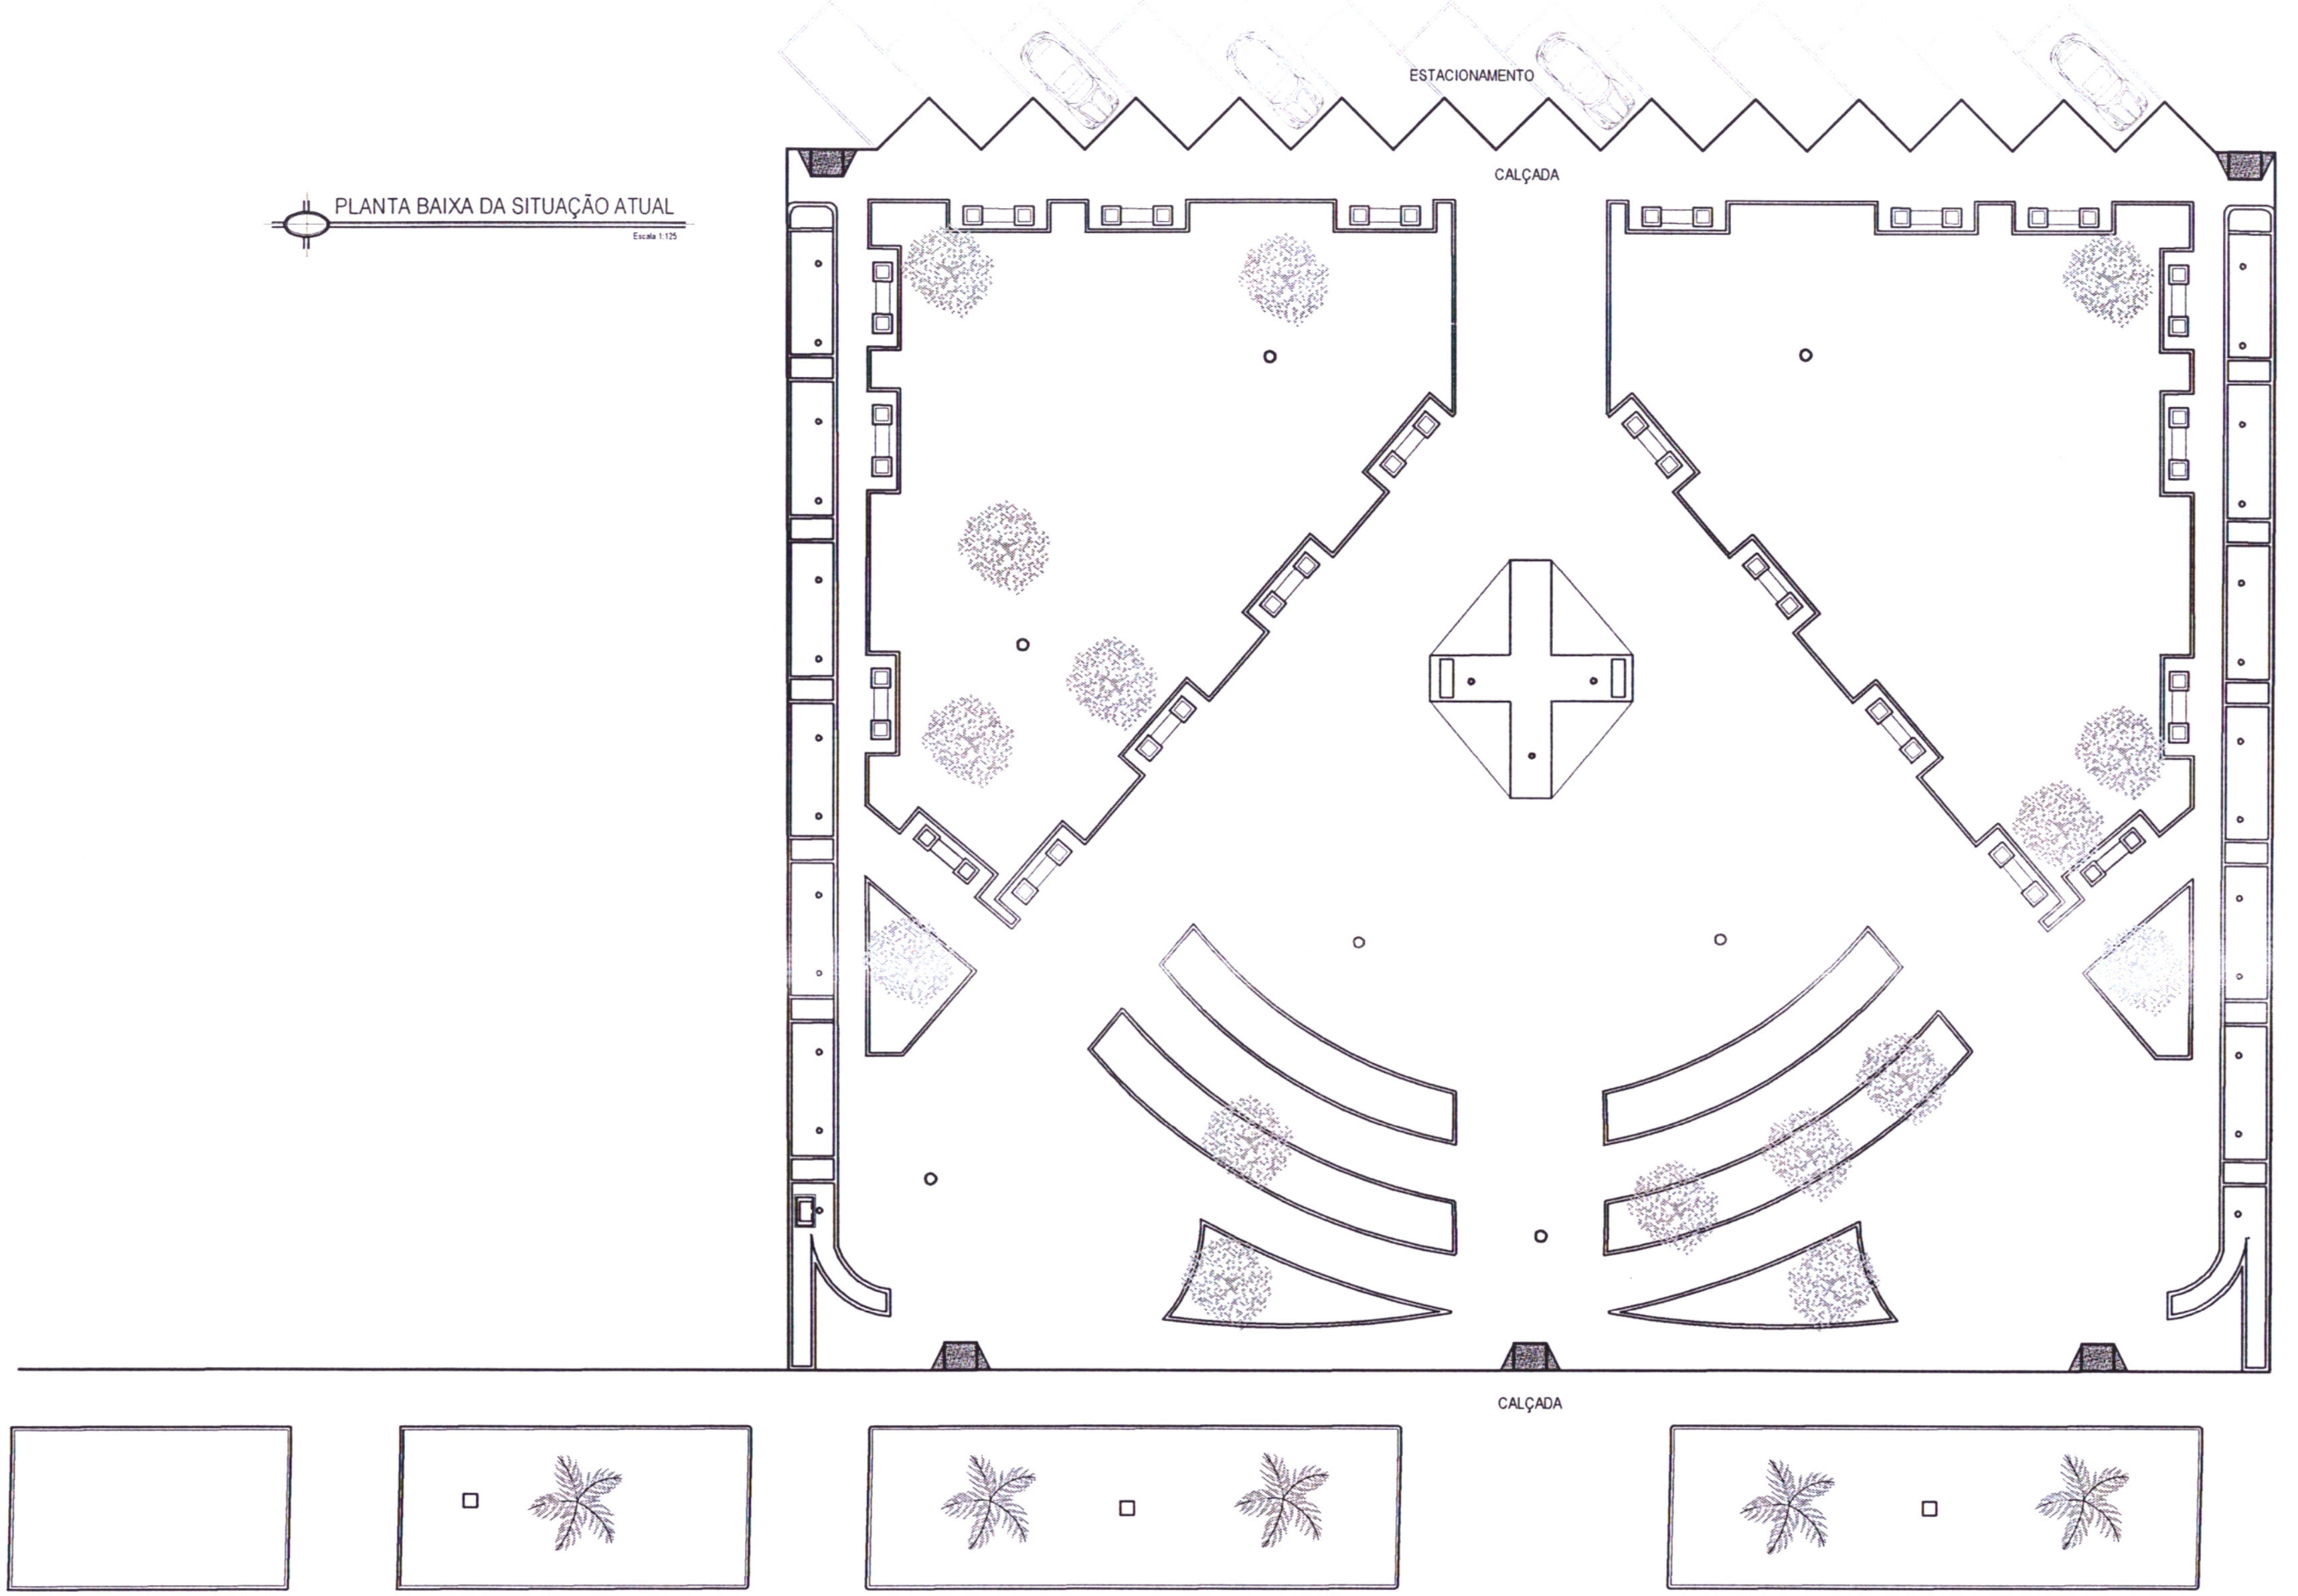


| ORIG. | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REV. | DATA | DESCRIÇÃO | LIBERADO PARA | VISTO | VISTO | AUTOR / PROJ. | VISTO / RESP. |
| | | | SECRETARIA DE OBRAS | | | PREFEITURA | |

SIMBOLOGIAS:

PROJETO: ESTRUTURAL

TUCURUÍ

APROVAÇÃO:

ARTHUR DE JESUS BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

Eng° FLORIVALDO VIEIRA MARTINS
Secretário de Obras
Port. N° 542/2017-GP

ÁREA DO TERRENO: | ÁREA CONSTRUÍDA:

Eng° RAIMUNDO NONATO DUTRA DUARTE
Responsável Técnico
CREA - RN: 150.180.722-6

ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DO CLIENTE E NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA QUAL ESTA SENDO FORNECIDO SEM A AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO PROJETISTA E DO CLIENTE.

DADOS DO PROJETO:

| | |
|---|---|
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ |
| OBRA: | REFORMA DA PRAÇA DA BANDEIRA |
| LOCAL: | BAIRRO CENTRO - TUCURUÍ/PA |
| CAD: | Arqª. JANY FERRAZ |
| ASSUNTO: | -PLANTA BAIXA DA SITUAÇÃO ATUAL |
| PRANCHA: | ARQ.01-01/03 |
| DATA: | MAIO / 2017 |
| ESCALA: | INDICADA |
| VERSÃO: | EXECUTIVO |

ARQUIVO:

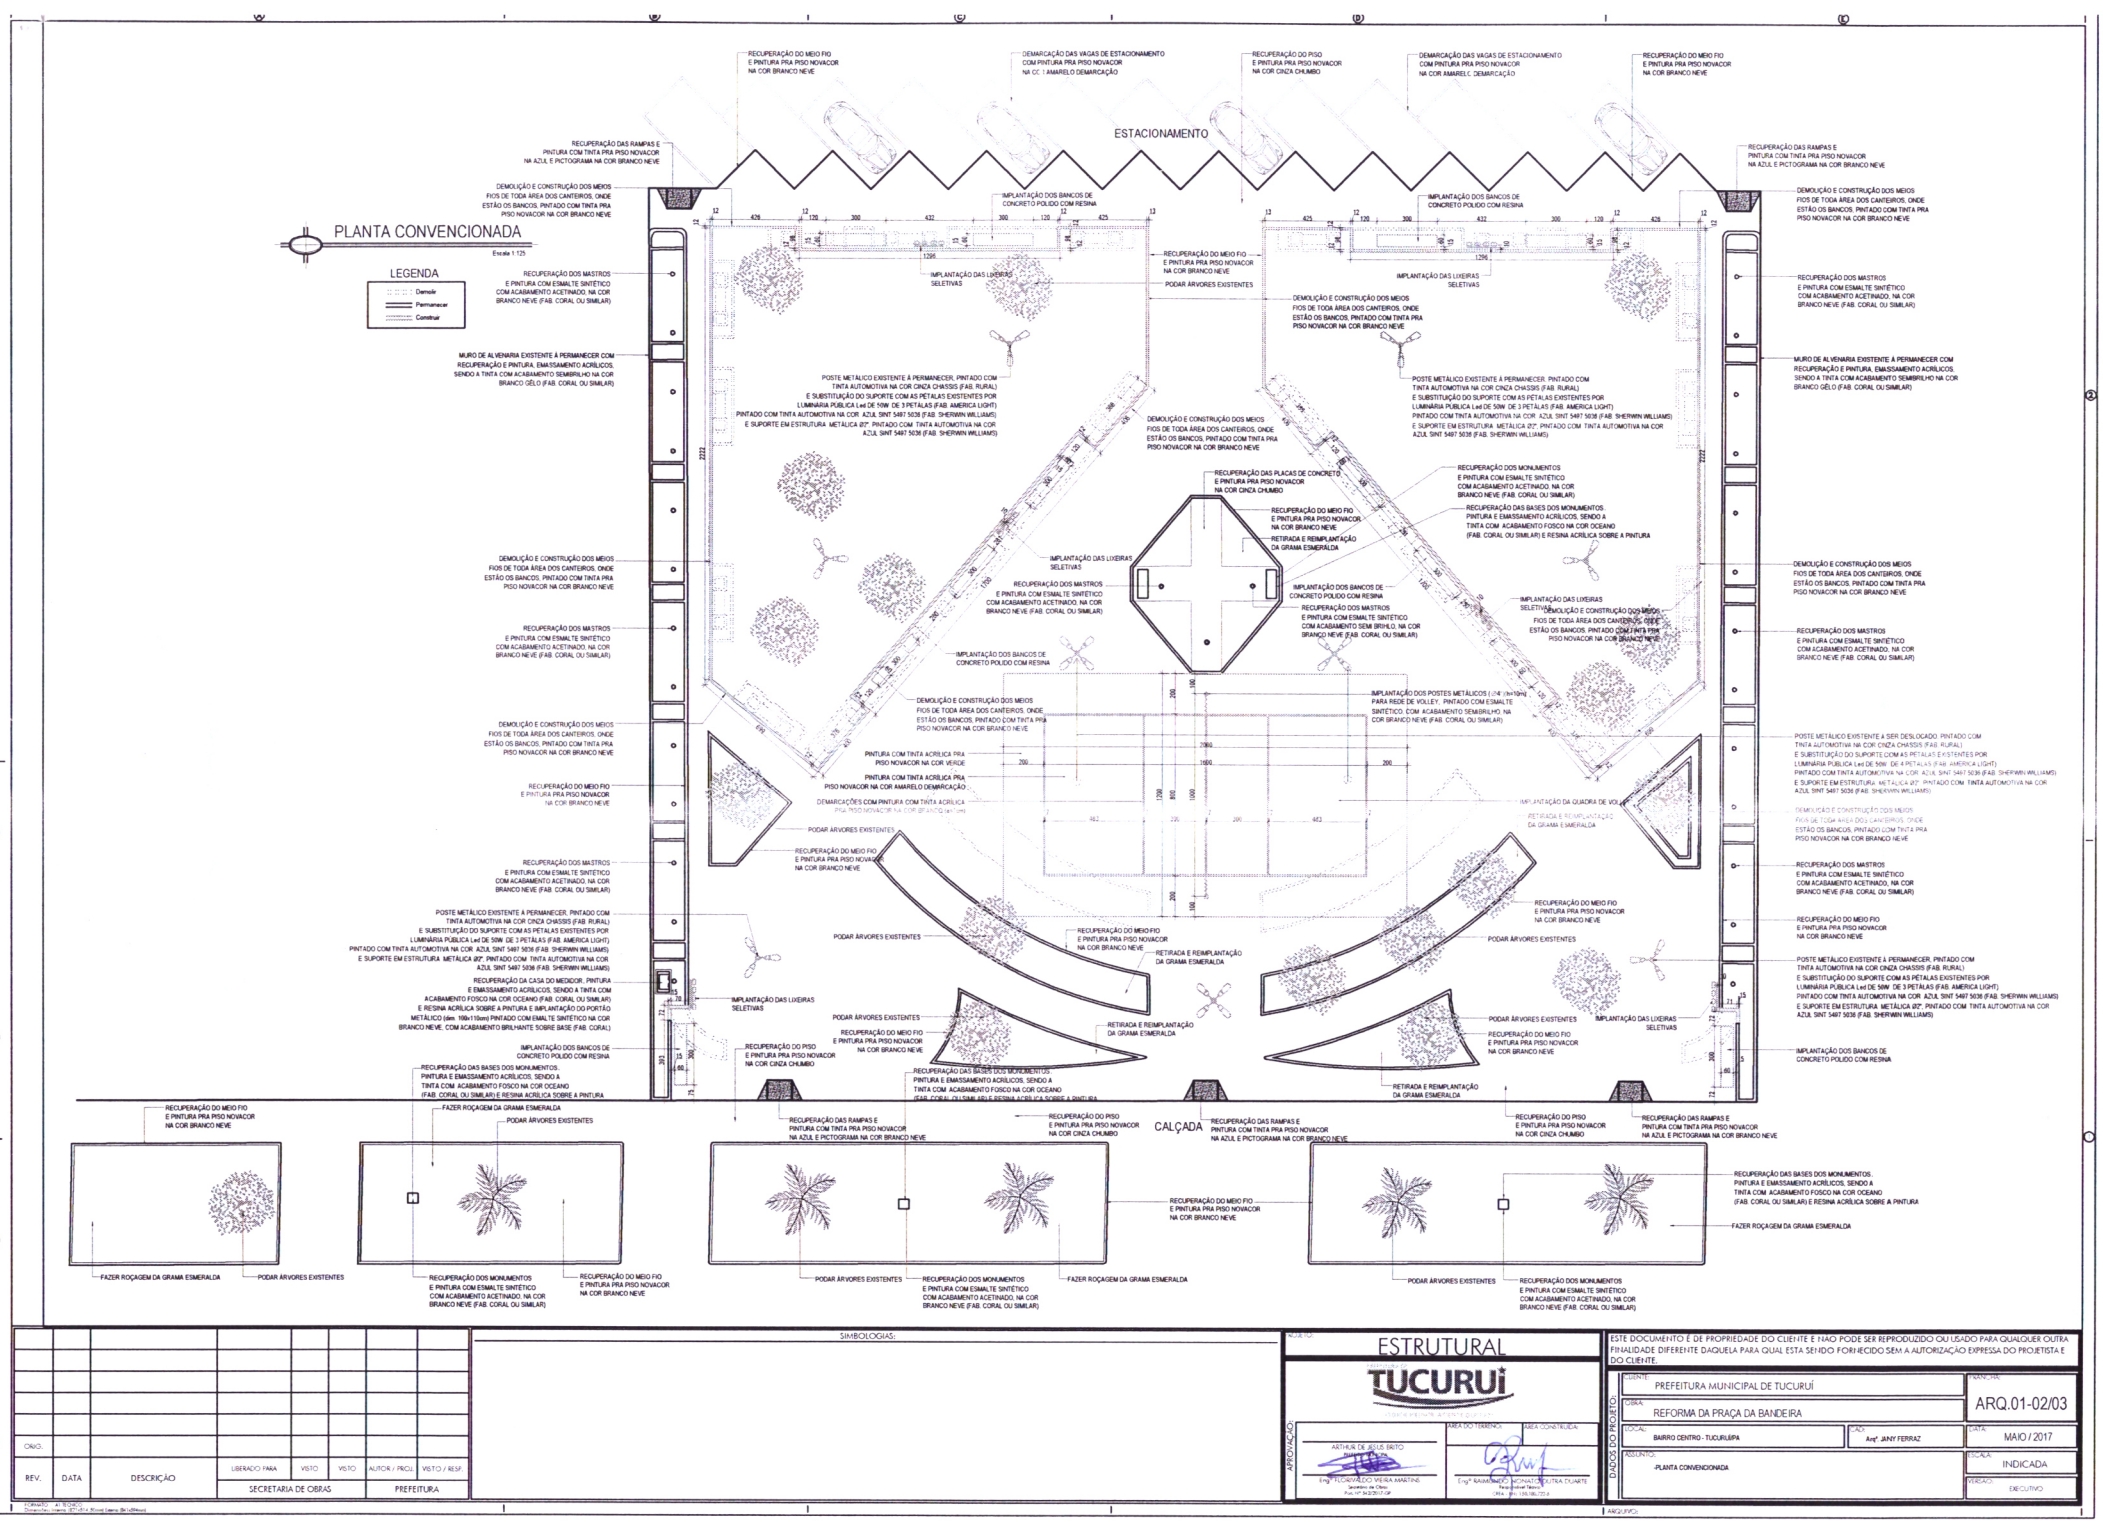


SIMBOLOGIAS:

| REV. | DATA | DESCRIÇÃO | LIBERADO PARA | VISTO | VISTO | AUTOR / PROJ. | VISTO / RESP. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SECRETARIA DE OBRAS | | | PREFEITURA | |

ONAG.

FORMATO: A1 TECNICO
Dimensão Interna: 877x614 Área Útil: 538,78 m²

PROJETO: ESTRUTURAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ

APROVAÇÃO

ARTHUR DE JESUS BRITO
Engº TUCURUÍ
Secretário de Obras
Port. Nº 54/2015/GP

ÁREA DO TERRENO: | ÁREA CONSTRUÍDA:

Engº RAIMUNDO JONATAS COSTA DUARTE
Responsável Técnico
CREA - PA / 059.780.772-0

ARQUIVO:

ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DO CLIENTE E NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA QUAL ESTA SENDO FORNECIDO SEM A AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO PROJETISTA E DO CLIENTE.

DADOS DO PROJETO:

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ

PRANCHA: ARQ.01-02/03

OBRA: REFORMA DA PRAÇA DA BANDEIRA

LOCAL: BAIRRO CENTRO - TUCURUÍ/PA

AUTOR: Arqª. JANY FERRAZ

DATA: MAIO / 2017

CONTEÚDO: -PLANTA CONVENCIONADA

ESCALA: INDICADA

PERÍODO: EXECUTIVO
