



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE ITAITUBA  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2017-TP.**

**ANEXO IX – PROJETO BÁSICO DE SERVIÇO.**

**OBJETO – PERFURAÇÃO DE 80(OITENTA) METROS DE POÇO SEMIARTESIANO NA  
E.M.E.F. DOM PEDRO I.**

**LOCAL: RUA DOM PEDRO I, S/N-BAIRRO BOM JARDIM-ITAITUBA/PARÁ.**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
Prefeitura Municipal de Itaituba  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA  
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



**OBRA:** ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 80 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, QUE SERÃO IMPLANTADOS EM VÁRIAS ESCOLAS URBANAS E RURAIS, ASSIM COMO EM LOCAIS PRÉVIAMENTE ESTRATÉGICO NA ZONA RURAL, TODOS OS POÇOS LOCALIZADOS NA CIDADE DE ITAITUBA ESTADO DO PARÁ.

**OBRA:** EMEIEF DOM PEDRO I

|                                                                                          |                          |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| <b>EMPRESA:</b>                                                                          | <b>CONCORRÊNCIA:</b>     | <b>CONTRATO:</b>                       |
| <b>PROPRIETÁRIO:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA                                    | <b>DATA DA VISTORIA:</b> | <b>DATA DA EXPEDIÇÃO:</b>              |
| <b>LOCAL DA OBRA:</b> RUA DOM PEDRO I, S/N – B. BOM JARDIM - CEP 68181-477- ITAITUBA-PA. |                          | <b>VALOR DA OBRA:</b><br>R\$ 66.272,81 |

| ITEM  | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                              | UNID | QUANT | PREÇO               |           | TABELA<br>SINAPI/PA - JUL./2017<br>SEDOP/PA - SET./2017 |                     | B.D.I<br>(%) | CURVA DO<br>ABC(%) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-----------|---------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------------|
|       |                                                                                                                                                         |      |       | UNITÁRIO<br>COM BDI | TOTAL     | Ref.Código                                              | UNITÁRIO<br>SEM BDI |              |                    |
| 1.0   | PERFURAÇÃO DO POÇO - 80 m                                                                                                                               |      |       | TOTAL PARCIAL       |           | 66.272,81                                               |                     |              |                    |
| 1.1   | SERVIÇOS PRELIMINARES:                                                                                                                                  |      |       |                     | 3.181,40  |                                                         |                     |              | 4,8005             |
| 1.1.1 | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTÂNCIA DE 10KM ATE 20KM.                                                                     | und. | 1     | 582,38              | 582,38    | SINAPI 72872                                            | 451,46              | 1,29         | 1,2682             |
| 1.1.2 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO. (Área de Proteção e Reservatório) | m²   | 120   | 10,27               | 1.232,21  | SINAPI 73992/001                                        | 7,96                | 1,29         | 1,8593             |
| 1.1.3 | Placa da obra em chapa galvanizada. 2,00x1,20m.                                                                                                         | m²   | 2     | 420,24              | 840,49    | SEDOP 010004                                            | 325,77              | 1,29         | 0,8788             |
| 1.1.4 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)                                                                                                     | m²   | 120   | 4,39                | 526,32    | SINAPI 73948/016                                        | 3,40                | 1,29         | 1,8593             |
| 1.2   | PERFURAÇÃO EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES                                                                                                                |      |       |                     | 4.029,96  |                                                         |                     |              | 6,0809             |
| 1.2.1 | Perfuração de poço com perfuratriz (com diâmetro DN 10 ")                                                                                               | m    | 80    | 50,37               | 4.029,96  | SINAPI 74163/001                                        | 39,05               | 1,29         | 6,0809             |
| 1.3   | PERFURAÇÃO EM ROCHA:                                                                                                                                    |      |       |                     | 6.164,78  |                                                         |                     |              | 9,3021             |
| 1.3.1 | Perfuração de poço com perfuratriz à percussão (com diâmetro DN 8")                                                                                     | m    | 70    | 88,07               | 6.164,78  | SINAPI 74163/002                                        | 68,27               | 1,29         | 9,3021             |
| 1.4   | ALARGAMENTO DO FURO:                                                                                                                                    |      |       |                     | 5.284,10  |                                                         |                     |              | 7,9733             |
| 1.4.1 | Perfuração de poço com perfuratriz à percussão (com diâmetro DN10")                                                                                     | m    | 60    | 88,07               | 5.284,10  | SINAPI 74163/002                                        | 68,27               | 1,29         | 7,9733             |
| 1.5   | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE                                                                                                              |      |       |                     | 40.196,13 |                                                         |                     |              | 60,6525            |
| 1.5.1 | TUBO GEO. 150x4mt, Ø6".                                                                                                                                 | m    | 48    | 442,39              | 21.234,84 | *COTAÇÃO LOCAL                                          | 342,94              | 1,29         | 32,0416            |
| 1.5.2 | MOTOBOMBA LEÃO 5CV 4R8PB-18 350/38                                                                                                                      | und. | 1     | 7.879,97            | 7.879,97  | *COTAÇÃO LOCAL                                          | 6.108,50            | 1,29         | 11,8902            |
| 1.5.3 | TUBO ROSCAVEL 1.1/2.                                                                                                                                    | m    | 72    | 129,00              | 9.288,00  | *COTAÇÃO LOCAL                                          | 100,00              | 1,29         | 14,0148            |
| 1.5.4 | CORDA BRANCA TRANÇADA 12MM                                                                                                                              | und. | 90    | 10,54               | 948,54    | *COTAÇÃO LOCAL                                          | 8,17                | 1,29         | 1,4313             |
| 1.5.5 | FITA AUTO FUSÃO 10M                                                                                                                                     | und. | 1     | 32,75               | 32,75     | *COTAÇÃO LOCAL                                          | 25,39               | 1,29         | 0,0494             |
| 1.5.6 | FITA VEDA ROSCA 18X50mts                                                                                                                                | und. | 4     | 11,65               | 46,59     | *COTAÇÃO LOCAL                                          | 9,03                | 1,29         | 0,0703             |
| 1.5.7 | Luva F"6" de 1 1/2" (IE)                                                                                                                                | und. | 12    | 10,09               | 121,05    | SEDOP 171044                                            | 7,82                | 1,29         | 0,1827             |

Lana Sabryna S. Aguiar  
Engenheira Civil  
CREA - PA 151604296-4

Ulisses Moreira Conde  
Técnico em Edificações  
rea 476-TD-PA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
Prefeitura Municipal de Itaituba  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA  
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



**OBRA:** ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 80 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, QUE SERÃO IMPLANTADOS EM VÁRIAS ESCOLAS URBANAS E RURAIS, ASSIM COMO EM LOCAIS PRÉVIAMENTE ESTRATÉGICO NA ZONA RURAL, TODOS OS POÇOS LOCALIZADOS NA CIDADE DE ITAITUBA ESTADO DO PARÁ.

**OBRA:** EMEIEF DOM PEDRO I

|                                                                                          |                          |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| <b>EMPRESA:</b>                                                                          | <b>CONCORRÊNCIA:</b>     | <b>CONTRATO:</b>                       |
| <b>PROPRIETÁRIO:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA                                    | <b>DATA DA VISTORIA:</b> | <b>DATA DA EXPEDIÇÃO:</b>              |
| <b>LOCAL DA OBRA:</b> RUA DOM PEDRO I, S/N – B. BOM JARDIM - CEP 68181-477- ITAITUBA-PA. |                          | <b>VALOR DA OBRA:</b><br>R\$ 66.272,81 |

| ITEM   | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                      | UNID  | QUANT | PREÇO               |          | TABELA<br>SINAPI/PA - JUL./2017<br>SEDOP/PA - SET./2017 |                     | B.D.I<br>(%) | CURVA DO<br>ABC(%) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------|----------|---------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       | UNITÁRIO<br>COM BDI | TOTAL    | Ref.Código                                              | UNITÁRIO<br>SEM BDI |              |                    |
| 1.5.8  | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                                                                                                        | und.  | 1     | 64,44               | 64,44    | SINAPI 92894                                            | 49,95               | 1,29         | 0,0972             |
| 1.5.9  | Curva 90° F" G" 1 1/2" (IE)                                                                                                                                                                                                                     | und.  | 1     | 84,52               | 84,52    | SEDOP 171263                                            | 65,52               | 1,29         | 0,1275             |
| 1.5.10 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE                                                                                                                                                            | und.  | 2     | 36,88               | 73,76    | SINAPI 92373                                            | 28,59               | 1,29         | 0,1113             |
| 1.5.11 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                                                                                     | und.  | 1     | 160,77              | 160,77   | SINAPI 73795/011                                        | 124,63              | 1,29         | 0,2426             |
| 1.5.12 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/ FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016.                                                           | und.  | 1     | 107,04              | 107,04   | SINAPI 94497                                            | 82,98               | 1,29         | 0,1615             |
| 1.5.13 | Curva 135° p/ elet. PVC 1 1/2" (IE)                                                                                                                                                                                                             | und.  | 2     | 30,34               | 60,68    | SEDOP 171100                                            | 23,52               | 1,29         | 0,0916             |
| 1.5.14 | ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 600 MM - Tampa para poço Artesiano com furo Central de 1 1/2"                                                                                                                                           | und.  | 1     | 93,16               | 93,16    | SINAPI 73607                                            | 72,22               | 1,29         | 0,1406             |
| 1.6    | <b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FILTROS:</b>                                                                                                                                                                                                    |       |       |                     | 4.536,75 |                                                         |                     |              | 6,8456             |
| 1.6.1  | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1. 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (Painel de Comando - Mureta Coberta). | und.  | 1     | 1.092,19            | 1.092,19 | SINAPI 72284                                            | 846,66              | 1,29         | 1,6480             |
| 1.6.2  | FILTRO GEO STANDER 150X4MT                                                                                                                                                                                                                      | und.  | 4     | 668,53              | 2.674,12 | *COTAÇÃO LOCAL                                          | 518,24              | 1,29         | 4,0350             |
| 1.6.3  | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA.                                                                                                                                                                                                             | m³    | 4     | 192,61              | 770,44   | SINAPI 6514                                             | 149,31              | 1,29         | 1,1625             |
| 1.7    | <b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA:</b>                                                                                                                                                                                            |       |       |                     | 2.671,41 |                                                         |                     |              | 4,0309             |
| 1.7.1  | POSTE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES SEM BASE C/JANELA 9M (INSPECAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO.                                                                                                                                            | unid. | 1     | 1.620,90            | 1.620,90 | SINAPI 73769/001                                        | 1.256,51            | 1,29         | 2,4458             |
| 1.7.2  | Cabo multiplex 3 x 10mm²                                                                                                                                                                                                                        | m     | 90    | 7,04                | 633,91   | SEDOP 170938                                            | 5,46                | 1,29         | 0,9565             |
| 1.7.3  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016                                                                                                                                                     | m     | 2     | 53,16               | 106,32   | SINAPI 93662                                            | 41,21               | 1,29         | 0,1604             |
| 1.7.4  | Centro de distribuição p/ 06 disjuntores (s/ barramento).                                                                                                                                                                                       | und.  | 1     | 95,86               | 95,86    | SEDOP 170884                                            | 74,31               | 1,29         | 0,1446             |

Lana Sabryna S. Aguiar  
Engenheira Civil  
CREA - PA 151604296-4

Ulisses Moreira Conde  
Técnico em Edificações  
REA 476-TD-PA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
Prefeitura Municipal de Itaituba  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA  
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



**OBRA:** ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 80 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, QUE SERÃO IMPLANTADOS EM VÁRIAS ESCOLAS URBANAS E RURAIS, ASSIM COMO EM LOCAIS PRÉVIAMENTE ESTRATÉGICO NA ZONA RURAL, TODOS OS POÇOS LOCALIZADOS NA CIDADE DE ITAITUBA ESTADO DO PARÁ.

**OBRA:** EMEIEF DOM PEDRO I

|                                                                                          |                          |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| <b>EMPRESA:</b>                                                                          | <b>CONCORRÊNCIA:</b>     | <b>CONTRATO:</b>                       |
| <b>PROPRIETÁRIO:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA                                    | <b>DATA DA VISTORIA:</b> | <b>DATA DA EXPEDIÇÃO:</b>              |
| <b>LOCAL DA OBRA:</b> RUA DOM PEDRO I, S/N – B. BOM JARDIM - CEP 68181-477- ITAITUBA-PA. |                          | <b>VALOR DA OBRA:</b><br>R\$ 66.272,81 |

| ITEM   | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                | UNID           | QUANT | PREÇO               |        | TABELA<br>SINAPI/PA - JUL./2017<br>SEDOP/PA - SET./2017 |                     | B.D.I<br>(%)<br>29% | CURVA DO<br>ABC(%) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------------------|--------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|        |                                                                                                                                                                                           |                |       | UNITÁRIO<br>COM BDI | TOTAL  | Ref.Código                                              | UNITÁRIO<br>SEM BDI |                     |                    |
| 1.7.5  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015.                                                                                               | m              | 6     | 11,61               | 69,66  | SINAPI 93008                                            | 9,00                | 1,29                | 0,1051             |
| 1.7.6  | HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR.                                                                      | unid.          | 2     | 60,63               | 121,26 | SINAPI 83485                                            | 47,00               | 1,29                | 0,1830             |
| 1.7.7  | GRAMPO PARALELO EM ALUMÍNIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2 PARAFUSOS, PARA CABO DE 6 A 50 MM <sup>2</sup> , PASTA ANTIOXIDANTE. FORNEC E INSTALAÇÃO. para Haste de Aterramento 5/8" (Conector) | unid.          | 2     | 11,75               | 23,50  | SINAPI 73767/001                                        | 9,11                | 1,29                | 0,0355             |
| 2.12   | <b>DIVERSOS:</b>                                                                                                                                                                          |                |       |                     | 208,28 |                                                         |                     |                     | 0,3143             |
| 2.12.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 78    | 2,67                | 208,28 | SINAPI 9537                                             | 2,07                | 1,29                | 0,3143             |

|                    |                      |           |               |                  |                 |
|--------------------|----------------------|-----------|---------------|------------------|-----------------|
| <b>CUSTO TOTAL</b> | <b>M<sup>2</sup></b> | <b>78</b> | <b>849,65</b> | <b>66.272,81</b> | <b>100,0000</b> |
|--------------------|----------------------|-----------|---------------|------------------|-----------------|

OBS: Todos os itens que estiverem o asterístico, ( \* ) refere-se aos materiais que não foi encontrado de maneira clara na tabela do SINAPI / Julho de 2.017 e nem no SEDOP / Setembro de 2.017. Portanto tivemos a liberdade de pesquisar no mercado local os valores sem BDI oferecido pelas Lojas de Materiais de Construção, seguindo em anêxos valores de cada estabelecimento comercial, onde aplicamos na Planilha Orçamentária aqui Orçada a MÉDIA PROPORCIONAL de cada item exposto incluso a Mão de Obra de 40% do material a serem aplicado.

Itaituba - Pa, 06 de Novembro de 2.017

Ulisses Moreira Conde  
Técnico em Edificações  
476-TD-PA

Lana Sabryna S. Aguiar  
LANA SABRYNA SIMÕES AGUIAR  
Engenheira Civil - CREA n° 151604296-4 - PA

Ulisses Moreira Conde  
Técnico em Edificações - CREA n° 476-TD - PA

Lana Sabryna S. Aguiar  
Engenheira Civil  
CREA - PA 151604296-4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA  
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



Ulisses Moreira Conde  
Técnico em Edificações  
Crea 478-TP-PA

Lana Sabryna S. Aguiar  
Engenheira Civil  
CREA - PA 151604296-4

| CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO DE CUSTO                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |         |            |                |                      |          |         |               | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------|----------------------|----------|---------|---------------|------------------------------|--|
| PERFURAÇÃO DE 80 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, QUE SERÃO IMPLANTADOS EM VÁRIAS ESCOLAS URBANAS E RURAIS, ASSIM COMO EM LOCAIS PRÉVIAMENTE ESTRATÉGICO NA ZONA RURAL, TODOS OS POÇOS LOCALIZADOS NA CIDADE DE ITAITUBA ESTADO DO PARÁ. |                                                                                                                                                         |         |            |                |                      |          |         |               | Data: 06/11/2.017            |  |
| OBRA:EMEIEF DOM PEDRO I                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |         |            |                |                      |          |         |               |                              |  |
| ENDEREÇO DA OBRA: RUA DOM PEDRO I, S/N – B. BOM JARDIM - CEP 68181-477- ITAITUBA-PA.                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                         |         |            |                |                      |          |         |               |                              |  |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                   | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                           | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | CONTRATO P/ 02 MESES | 30 DIAS  | 60 DIAS | TOTAL PARCIAL |                              |  |
| 1.0                                                                                                                                                                                                                                                    | PERFURAÇÃO DO POÇO - 80 m                                                                                                                               |         |            |                |                      |          |         |               |                              |  |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                    | SERVIÇOS PRELIMINARES:                                                                                                                                  |         |            |                |                      |          |         |               |                              |  |
| 1.1.1                                                                                                                                                                                                                                                  | MOBILIZACAO E INSTALCAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA DE 10KM ATE 20KM.                                                                      | und.    | 1          | 582,38         | 100%                 | 100%     | -       | 100%          |                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |         |            |                | 582,38               | 582,38   | -       | 582,38        |                              |  |
| 1.1.2                                                                                                                                                                                                                                                  | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO. (Área de Proteção e Reservatório) | m²      | 120        | 10,27          | 100%                 | 100%     | -       | 100%          |                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |         |            |                | 1.232,21             | 1.232,21 | -       | 1.232,21      |                              |  |
| 1.1.3                                                                                                                                                                                                                                                  | Placa da obra em chapa galvanizada. 2,00x1,20m.                                                                                                         | m²      | 2          | 420,24         | 100%                 | 100%     | -       | 100%          |                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |         |            |                | 840,49               | 840,49   | -       | 840,49        |                              |  |
| 1.1.4                                                                                                                                                                                                                                                  | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)                                                                                                     | m²      | 120        | 4,39           | 100%                 | 100%     | -       | 100%          |                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |         |            |                | 526,32               | 526,32   | -       | 526,32        |                              |  |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                                                    | PERFURAÇÃO EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES                                                                                                                |         |            |                |                      |          |         |               |                              |  |
| 1.2.1                                                                                                                                                                                                                                                  | Perfuração de poço com perfuratriz (com diâmetro DN 10 ")                                                                                               | m       | 80,00      | 50,37          | 100%                 | 100%     | -       | 100%          |                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |         |            |                | 4.029,96             | 4.029,96 | -       | 4.029,96      |                              |  |
| 1.3                                                                                                                                                                                                                                                    | PERFURAÇÃO EM ROCHA:                                                                                                                                    |         |            |                |                      |          |         |               |                              |  |
| 1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                  | Perfuração de poço com perfuratriz à percussão (com diâmetro DN 8")                                                                                     | m       | 70,00      | 88,07          | 100%                 | 100%     | -       | 100%          |                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |         |            |                | 6.164,78             | 6.164,78 | -       | 6.164,78      |                              |  |



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA  
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



Ulisses Moreira Conde  
Técnico em Edificações  
Crea 476-T/PA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO DE CUSTO

PERFURAÇÃO DE 80 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, QUE SERÃO IMPLANTADOS EM VÁRIAS ESCOLAS URBANAS E RURAIS, ASSIM COMO EM LOCAIS PRÉVIAMENTE ESTRATÉGICO NA ZONA RURAL, TODOS OS POÇOS LOCALIZADOS NA CIDADE DE ITAITUBA ESTADO DO PARÁ.

CRONOGRAMA  
FÍSICO  
FINANCEIRO

Data:  
06/11/2.017

OBRA: EMEIEF DOM PEDRO I

ENDEREÇO DA OBRA: RUA DOM PEDRO I, S/N - B. BOM JARDIM - CEP 68181-477- ITAITUBA-PA.

| ITEM  | DISCRIMINAÇÃO                                                       | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | CONTRATO p/<br>02 MÊSES | 30 DIAS          | 60 DIAS          | TOTAL<br>PARCIAL  |
|-------|---------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1.4   | ALARGAMENTO DO FURO:                                                |         |            |                |                         |                  |                  |                   |
| 1.4.1 | Perfuração de poço com perfuratriz à percussão (com diâmetro DN10") | m       | 60,00      | 88,07          | 100%<br>5.284,10        | 100%<br>5.284,10 | -<br>-           | 100%<br>5.284,10  |
| 1.5   | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE                          |         |            |                |                         |                  |                  |                   |
| 1.5.1 | TUBO GEO. 150x4mt, Ø6".                                             | m       | 48,00      | 442,39         | 100%<br>21.234,84       | 50%<br>10.617,42 | 50%<br>10.617,42 | 100%<br>21.234,84 |
| 1.5.2 | MOTOBOMBA LEÃO 5CV 4R8PB-18 350/38                                  | und.    | 1,00       | 7.879,97       | 100%<br>7.879,97        | 50%<br>3.939,98  | 50%<br>3.939,98  | 100%<br>7.879,97  |
| 1.5.3 | TUBO ROSCAVEL 1.1/2.                                                | m       | 72,00      | 129,00         | 100%<br>9.288,00        | 50%<br>4.644,00  | 50%<br>4.644,00  | 100%<br>9.288,00  |
| 1.5.4 | CORDA BRANCA TRANÇADA 12MM                                          | und.    | 90,00      | 10,54          | 100%<br>948,54          | 50%<br>474,27    | 50%<br>474,27    | 100%<br>948,54    |
| 1.5.5 | FITA AUTO FUSÃO 10M                                                 | und.    | 1,00       | 32,75          | 100%<br>32,75           | 50%<br>16,38     | 50%<br>16,38     | 100%<br>32,75     |
| 1.5.6 | FITA VEDA ROSCA 18X50mts                                            | und.    | 4,00       | 11,65          | 100%<br>46,59           | 50%<br>23,30     | 50%<br>23,30     | 100%<br>46,59     |
| 1.5.7 | Luva FºGº de 1 1/2" (IE)                                            | und.    | 12,00      | 10,09          | 100%<br>121,05          | 50%<br>60,53     | 50%<br>60,53     | 100%<br>121,05    |

Lana Sabryna S. Aguiar  
Engenheira Civil  
CREA - PA 151604296-4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
Prefeitura Municipal de Itaituba  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA  
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS

Ulisses Moreira Conde  
Técnico em Edificações  
15/04/2014



| CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO DE CUSTO                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |         |            |                |                      |         |         |               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------|----------------------|---------|---------|---------------|--|
| PERFURAÇÃO DE 80 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, QUE SERÃO IMPLANTADOS EM VÁRIAS ESCOLAS URBANAS E RURAIS, ASSIM COMO EM LOCAIS PRÉVIAMENTE ESTRATÉGICO NA ZONA RURAL, TODOS OS POÇOS LOCALIZADOS NA CIDADE DE ITAITUBA ESTADO DO PARÁ. |                                                                                                                                                                                       |         |            |                |                      |         |         |               |  |
| OBRA:EMEIEF DOM PEDRO I                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |         |            |                |                      |         |         |               |  |
| ENDEREÇO DA OBRA: RUA DOM PEDRO I, S/N - B. BOM JARDIM - CEP 68181-477- ITAITUBA-PA.                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |         |            |                |                      |         |         |               |  |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                   | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                         | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | CONTRATO p/ 02 MÊSES | 30 DIAS | 60 DIAS | TOTAL PARCIAL |  |
| 1.5.8                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                              | und.    | 1,00       | 64,44          | 100%                 | 50%     | 50%     | 100%          |  |
| 1.5.9                                                                                                                                                                                                                                                  | Curva 90° F°G° 1 1/2" (IE)                                                                                                                                                            | und.    | 1,00       | 84,52          | 100%                 | 50%     | 50%     | 100%          |  |
| 1.5.10                                                                                                                                                                                                                                                 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                | und.    | 2,00       | 36,88          | 100%                 | 50%     | 50%     | 100%          |  |
| 1.5.11                                                                                                                                                                                                                                                 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                           | und.    | 1,00       | 160,77         | 100%                 | 50%     | 50%     | 100%          |  |
| 1.5.12                                                                                                                                                                                                                                                 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/ FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016. | und.    | 1,00       | 107,04         | 100%                 | 50%     | 50%     | 100%          |  |
| 1.5.13                                                                                                                                                                                                                                                 | Curva 135° p/ elet. PVC 1 1/2" (IE)                                                                                                                                                   | und.    | 2,00       | 30,34          | 100%                 | 50%     | 50%     | 100%          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       |         |            |                | 60,68                | 30,34   | 30,34   | 60,68         |  |

Lana Sabryna S. Aguiar  
Engenharia Civil  
CREA - PA 151604296-4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA  
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO DE CUSTO

PERFURAÇÃO DE 80 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, QUE SERÃO IMPLANTADOS EM VÁRIAS ESCOLAS URBANAS E RURAIS, ASSIM COMO EM LOCAIS PRÉVIAMENTE ESTRATÉGICO NA ZONA RURAL, TODOS OS POÇOS LOCALIZADOS NA CIDADE DE ITAITUBA ESTADO DO PARÁ.

OBRA: EMEIEF DOM PEDRO I

ENDEREÇO DA OBRA: RUA DOM PEDRO I, S/N - B. BOM JARDIM - CEP 68181-477- ITAITUBA-PA.

| ITEM   | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | CONTRATO P/ 02 MÊSES | 30 DIAS  | 60 DIAS  | TOTAL PARCIAL |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------|----------------------|----------|----------|---------------|
| 1.5.14 | ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM - Tampa para poço Artesiano com furo Central de 1 1/2"                                                                                                                                                        | und.    | 1,00       | 93,16          | 100%                 | 50%      | 50%      | 100%          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                              |         |            |                | 93,16                | 46,58    | 46,58    | 93,16         |
| 1.6    | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FILTROS:                                                                                                                                                                                                                        |         |            |                |                      |          |          |               |
| 1.6.1  | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2", MANGUEIRA DE ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1. 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (Painel de Comando - Mureta Coberta). | und.    | 1,00       | 1.092,19       | 100%                 | 50%      | 50%      | 100%          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                              |         |            |                | 1.092,19             | 546,10   | 546,10   | 1.092,19      |
| 1.6.2  | FILTRO GEO STANDER 150X4MT                                                                                                                                                                                                                                   | und.    | 4,00       | 668,53         | 100%                 | 50%      | 50%      | 100%          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                              |         |            |                | 2.674,12             | 1.337,06 | 1.337,06 | 2.674,12      |
| 1.6.3  | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA.                                                                                                                                                                                                                          | m³      | 4,00       | 192,61         | 100%                 | 50%      | 50%      | 100%          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                              |         |            |                | 770,44               | 385,22   | 385,22   | 770,44        |
| 1.7    | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA:                                                                                                                                                                                                                |         |            |                |                      |          |          |               |

Lana Sabryna S. Aguiar  
Engenhaira Civil  
CREA - PA 151604296-4

CRONOGRAMA  
FÍSICO  
FINANCEIRO  
Data:  
06/11/2.017



Ulisses Moreira Conde  
Técnico em Edificações  
Rua 476-TPA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA  
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



Ulisses Moreira Conde  
Técnico em Edificações  
Ins. Are-TPA

| CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO DE CUSTO                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |         |            |                |                      |         |         |               | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------|----------------------|---------|---------|---------------|------------------------------|
| PERFURAÇÃO DE 80 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, QUE SERÃO IMPLANTADOS EM VÁRIAS ESCOLAS URBANAS E RURAIS, ASSIM COMO EM LOCAIS PRÉVIAMENTE ESTRATÉGICO NA ZONA RURAL, TODOS OS POÇOS LOCALIZADOS NA CIDADE DE ITAITUBA ESTADO DO PARÁ. |                                                                                                                      |         |            |                |                      |         |         |               | Data: 06/11/2.017            |
| OBRA:EMEIEF DOM PEDRO I                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |         |            |                |                      |         |         |               |                              |
| ENDEREÇO DA OBRA: RUA DOM PEDRO I, S/N – B. BOM JARDIM - CEP 68181-477- ITAITUBA-PA.                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |         |            |                |                      |         |         |               |                              |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                   | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                        | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | CONTRATO P/ 02 MESES | 30 DIAS | 60 DIAS | TOTAL PARCIAL |                              |
| 1.7.1                                                                                                                                                                                                                                                  | POSTE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES SEM BASE C/JANELA 9M (INSPECAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO.                 | unid.   | 1,00       | 1.620,90       | 100%                 | 50%     | 50%     | 100%          |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |         |            |                | 1.620,90             | 810,45  | 810,45  | 1.620,90      |                              |
| 1.7.2                                                                                                                                                                                                                                                  | Cabo multiplex 3 x 10mm²                                                                                             | m       | 90,00      | 7,04           | 100%                 | 50%     | 50%     | 100%          |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |         |            |                | 633,91               | 316,95  | 316,95  | 633,91        |                              |
| 1.7.3                                                                                                                                                                                                                                                  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016                          | m       | 2,00       | 53,16          | 100%                 | 50%     | 50%     | 100%          |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |         |            |                | 106,32               | 53,16   | 53,16   | 106,32        |                              |
| 1.7.4                                                                                                                                                                                                                                                  | Centro de distribuição p/ 06 disjuntores (s/ barramento).                                                            | und.    | 1,00       | 95,86          | 100%                 | 50%     | 50%     | 100%          |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |         |            |                | 95,86                | 47,93   | 47,93   | 95,86         |                              |
| 1.7.5                                                                                                                                                                                                                                                  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015.                          | m       | 6,00       | 11,61          | 100%                 | 50%     | 50%     | 100%          |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |         |            |                | 69,66                | 34,83   | 34,83   | 69,66         |                              |
| 1.7.6                                                                                                                                                                                                                                                  | HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR. | unid.   | 2,00       | 60,63          | 100%                 | 50%     | 50%     | 100%          |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |         |            |                | 121,26               | 60,63   | 60,63   | 121,26        |                              |

  
Lana Sabryna S. Aguiar  
Engenheira Civil  
CREA - PA 151604296-4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
Prefeitura Municipal de Itaituba  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA  
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS

Ulisses Moreira Conde  
Técnico em Edificações  
Crea 476/TD-PA



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO DE CUSTO

PERFURAÇÃO DE 80 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, QUE SERÃO IMPLANTADOS EM VÁRIAS ESCOLAS URBANAS E RURAIS, ASSIM COMO EM LOCAIS PRÉVIAMENTE ESTRATÉGICO NA ZONA RURAL, TODOS OS POÇOS LOCALIZADOS NA CIDADE DE ITAITUBA ESTADO DO PARÁ.

CRONOGRAMA  
FÍSICO  
FINANCEIRO

Data:  
06/11/2.017

OBRA:EMEIEF DOM PEDRO I

ENDEREÇO DA OBRA: RUA DOM PEDRO I, S/N - B. BOM JARDIM - CEP 68181-477- ITAITUBA-PA.

| ITEM                   | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | CONTRATO P/ 02 MESES | 30 DIAS   | 60 DIAS   | TOTAL PARCIAL |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------|----------------------|-----------|-----------|---------------|
| 1.7.7                  | GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2 PARAFUSOS, PARA CABO DE 6 A 50 MM2, PASTA ANTIOXIDANTE. FORNEC E INSTALAÇÃO. para Haste de Aterramento 5/8" (Conector) | unid.   | 2,00       | 11,75          | 100%                 | 50%       | 50%       | 100%          |
| 2.12                   | DIVERSOS:                                                                                                                                                                    |         |            |                | 23,50                | 11,75     | 11,75     | 23,50         |
| 2.12.1                 | LIMPEZA FINAL DA OBRA                                                                                                                                                        | m²      | 78,00      | 2,67           | 100%                 | -         | 100%      | 100%          |
| TOTAL SIMPLES R\$      |                                                                                                                                                                              |         |            |                | 208,28               | -         | 208,28    | 208,28        |
| TOTAL ACUMULADO R\$    |                                                                                                                                                                              |         |            |                | 66.272,81            | 42.362,38 | 23.910,43 | 66.272,81     |
| Percentual Simples %   |                                                                                                                                                                              |         |            |                | -                    | 23.910,43 | 0,00      | -             |
| Percentual Acumulado % |                                                                                                                                                                              |         |            |                | -                    | 63,92%    | 36,08%    | -             |
|                        |                                                                                                                                                                              |         |            |                | -                    | 63,92%    | 0,00%     | -             |

OBS: Todos os itens que estiverem o asterístico, ( \* ) refere-se aos materiais que não foi encontrado de maneira clara na tabela do SINAPI / Julho de 2.017 e nem no SEDOP / Setembro de 2.017. Portanto tivemos a liberdade de pesquisar no mercado local os valores sem BDI oferecido pelas Lojas de Materiais de Construção , seguindo em anêxos valores de cada estabelecimento comercial, onde aplicamos na Planilha Orçamentária aqui Orçada a MÉDIA PROPORCIONAL de cada item exposto.

Lana Sabryna S. Aguiar  
Engenheira Civil - CREA n° 151604296-4 - PA

Ulisses Moreira Conde  
Técnico em Edificações - CREA n° 476/TD - PA

Itaituba - Pa, 06 de Novembro de 2.017



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
Prefeitura Municipal de Itaituba  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA  
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



**COTAÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DAS LOJAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOCAL**


| PERFURAÇÃO DE 80 METROS LINEARES EM POÇO ARTESIANO COM DIÂMETRO DE 6"                |                                     |       |        |                        |                             |                        |                                              |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|--------|------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| OBRA: EMEIEF DOM PEDRO I                                                             |                                     |       |        |                        |                             |                        |                                              |                      |
| ENDEREÇO DA OBRA: RUA DOM PEDRO I, S/N - B. BOM JARDIM - CEP 68181-477- ITAITUBA-PA. |                                     |       |        |                        |                             |                        |                                              |                      |
| Item                                                                                 | Descrição                           | Unid. | Quant. | FEIRÃO DA CONSTRUÇÃO   | LOJA DO CONSTRUTOR          | CASA BRANCA MATERIAIS  | Valor Unitário da Média Proporcional sem BDI | CÓDIGO DE REFERÊNCIA |
|                                                                                      |                                     |       |        | Código                 | Código                      | Código                 |                                              |                      |
|                                                                                      |                                     |       |        | Valor Unitário sem BDI | Valor Unitário sem BDI      | Valor Unitário sem BDI |                                              |                      |
| 1                                                                                    | TUBO GEO. 150x4mt, Ø6" LUPERPLAS.   | VARA  | 1      | 805<br>R\$ 380,00      | 25<br>R\$ 305,88            | -                      | R\$ 342,94                                   | *COTAÇÃO LOCAL       |
| 3                                                                                    | TUBO ROSCAVEL 1.1/2 LUPERPLAS       | VARA  | 1      | 811<br>R\$ 100,00      | 1115968<br>R\$ 100,00       | -                      | R\$ 100,00                                   | *COTAÇÃO LOCAL       |
| 5                                                                                    | CORDA BRANCA TRANÇADA 12MM          | METRO | 1      | 1998<br>R\$ 5,00       | 812667<br>R\$ 17,00         | 2722<br>R\$ 2,50       | R\$ 8,17                                     | *COTAÇÃO LOCAL       |
| 6                                                                                    | FITA VEDA ROSCA 18X50mts            | UNID  | 1      | 9595<br>R\$ 10,00      | 1651151<br>R\$ 7,06         | 179<br>R\$ 10,99       | R\$ 9,03                                     | *COTAÇÃO LOCAL       |
| 7                                                                                    | FITA AUTO FUSÃO 10M                 | UNID  | 1      | 35<br>R\$ 27,00        | 509396<br>R\$ 21,18         | 364<br>R\$ 28,00       | R\$ 25,39                                    | *COTAÇÃO LOCAL       |
| 8                                                                                    | MOTOBOMBA LEÃO 5CV 4R8PB-18 350/38  | UNID  | 1      | 339<br>R\$ 6.500,00    | 20000008684<br>R\$ 5.717,00 | -                      | R\$ 6.108,50                                 | *COTAÇÃO LOCAL       |
| 9                                                                                    | FILTRO GEO STANDER 150X4MT - LUPERI | UNID  | 1      | 8159<br>R\$ 500,00     | 1115146<br>R\$ 536,47       | -                      | R\$ 518,24                                   | *COTAÇÃO LOCAL       |

OBS: Todos os itens que estiverem o asterístico, ( \* ) refere-se aos materiais que não foi encontrado de maneira clara na tabela do SINAPI / Julho de 2.017 e nem no SEDOP / Setembro de 2.017. Portanto tivemos a liberdade de pesquisar no mercado local os valores sem BDI oferecido pelas Lojas de Materiais de Construção, seguindo em anêxos valores de cada estabelecimento comercial, onde aplicamos na Planilha Orçamentária aqui Orçada a MÉDIA PROPORCIONAL de cada item exposto incluso a Mão de Obra de 40% do material a serem

Itaituba - Pa, 06 de Novembro de 2.017

  
**LANA SABRYNA SIMÕES AGUIAR**  
Engenheira Civil - CREA nº 151604296-4 - PA

Lana Sabryna S. Aguiar  
Engenheira Civil  
CREA - PA 151604296-4

  
**ULISSES MOREIRA CONDE**  
Técnico em Edificações - CREA nº 476/TD - PA

Ulisses Moreira Conde  
Técnico em Edificações  
CREA 476-TD-PA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
Prefeitura Municipal de Itaituba

**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA**  
**DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS**



## **MEMORIAL DESCRITIVO DE POÇO TUBULAR SEMIARTESIANO**

  
Ulisses Moreira Conde  
Técnico em Edificações  
Rég. 478-TT-PA

**ITAITUBA**  
**2017**

  
Lana Sabryna S. Aguiar  
Engenheira Civil  
Crea. PA 151804298-4




REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
Prefeitura Municipal de Itaituba

**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA**  
**DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS**



## Sumário

|     |                                                            |   |
|-----|------------------------------------------------------------|---|
| 1   | LOCALIZAÇÃO DA OBRA.....                                   | 3 |
| 2   | NORMAS GERAIS.....                                         | 3 |
| 2.1 | DESCRIÇÃO GERAL.....                                       | 3 |
| 3   | PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO DA OBRA.....                      | 4 |
| 3.1 | CONSTRUÇÃO DO POÇO .....                                   | 4 |
| 3.2 | REVESTIMENTO .....                                         | 5 |
| 3.3 | APLICAÇÃO DE PRÉ-FILTRO .....                              | 5 |
| 3.4 | LAJE DE PROTEÇÃO DO POÇO.....                              | 5 |
| 3.5 | LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO DO POÇO .....                    | 5 |
| 3.6 | TESTE DE VAZÃO.....                                        | 5 |
| 3.7 | BOLETIM DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E BACTERIOLÓGICAS..... | 5 |
| 3.8 | PRAZO DE EXECUÇÃO.....                                     | 6 |

  
Ulisses Moreira Conde  
Técnico em Edificações  
Crea 476-PT-Pa

  
Larissa Sabryna S. Aguiar  
Engenheira Civil  
Crea-Pa 151604298-4



## 1 LOCALIZAÇÃO DA OBRA

EMEIEF DOM PEDRO I  
RUA DOM PEDRO I, S/N – B. BOM JARDIM - CEP 68181-477- ITAITUBA-PA.

Coordenadas UTM: 611157,00m E 9527258,00m S



## 2 NORMAS GERAIS

### 2.1 DESCRIÇÃO GERAL

O presente Memorial Descritivo fixa as diretrizes básicas para a construção de poço Tubular Semiartesiano na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental DOM PEDRO I, na Rua Dom Pedro I, S/N, bairro Bom Jardim, para que viabilize o abastecimento de água potável a esse Centro Educacional, o poço abastecerá um reservatório elevado já existente nas dependências do mesmo, a obra deverá ser executada de acordo com as especificações técnicas que seguem dentro das normas de construção, como as especificações contidas neste memorial e planilhas orçamentárias, sendo prazo de execução da obra de 60 (sessenta) dias, antes do início da obra a empresa contratada deverá informar o Engenheiro Fiscal da Prefeitura Municipal de Itaituba a intenção de início das obras.

Os materiais a serem empregados na obra deverão ser de qualidade que não comprometa o desempenho, o resultado geral da obra e a finalidade para o qual

Lana Sabryna S. Aguiar  
Engenheira Civil  
Crea-Pa 151804298-1

Ulisses Moreira Conde  
Técnico em Edificações  
Pa 478-TD-PA



se destina. A empresa contratada deverá ter um responsável técnico para fazer o acompanhamento da montagem dos poços artesiano.

### 3 PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO DA OBRA

A contratada deverá executar a obra atendendo as exigências contidas na **NBR 12.244 (Construção de poço para captação de águas subterrânea)** e **Decreto nº 32.955** de 07/02/1991 (Lei nº 6.134).

#### 3.1 CONSTRUÇÃO DO POÇO

Perfuração do poço tubular semiartesianos de 80m será através de máquina perfuratriz do tipo pneumática ou rotativa com perfuração do tipo 10" de diâmetro com uso de broca tricônica diamantada ou similar, com cisterna de lama para lavagem de material da escavação do poço.

Competência do Contratado:

80 metros de perfuração do poço em 10", incluindo transporte e montagem de canteiro e equipamentos

| LISTA DE MATERIAL PARA O POÇO |                                                    |         |                |        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|---------|----------------|--------|
| ITEM                          | DISCRIMINAÇÃO                                      | UNIDADE | DN (Pol. / mm) | QUANT. |
| 1                             | Abraçadeiras de Nylon                              | und.    | 100            | 12     |
| 2                             | Cabo Para Ligação da Bomba (Cabo PP # 3x4mm)       | m       | 4mm            | 90     |
| 3                             | CAP Fêmea Geomecânico STD                          | und.    | 6"             | 1      |
| 4                             | Corda Branca Trançada                              | m       | 12mm           | 90     |
| 5                             | Curva 90° - F°G°                                   | und.    | 1. 1/2"        | 1      |
| 6                             | Filtro Geo Stander - (150mmx4m)                    | m       | 6"             | 16     |
| 7                             | Luva em F°G°                                       | und.    | 1. 1/2"        | 12     |
| 8                             | Motobomba Leão 5Cv 4R8Pb-18 350/38                 | und.    |                | 1      |
| 9                             | Niple, em Ferro Galvanizado - (Ø 40mm)             | und.    | 1. 1/2"        | 3      |
| 10                            | Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável.         | und.    | 1.1/2 "        | 1      |
| 11                            | Tampa p/ Poço Artesiano com Furo Central de 1.1/2" | und.    | 6"             | 1      |
| 12                            | Tubo Geomecânico (150mm x 4m)                      | m       | 6"             | 50     |
| 13                            | Tubo PVC Roscável                                  | m       | 1.1/2 "        | 78     |
| 14                            | União, Em Ferro Galvanizado - (Ø 40mm)             | und.    | 1.1/2 "        | 2      |
| 15                            | Válvula De Retenção Horizontal - (Ø 40mm)          | und.    | 1.1/2 "        | 1      |

Lana Sabryna S. Aguiar  
Engenheira Civil  
Crea-PA 15160428

Ulisses Moreira Conde  
Técnico em Edificações  
Crea 476-TD-PA



### 3.2 REVESTIMENTO

Com a elevação da sonda de perfuração será procedida a descida ordenada dos revestimentos e filtros geomecânico, utilizando centralizadores em intervalos previamente estabelecidos para evitar que a coluna entre em contato com a parede de perfuração. Os filtros deverão ser instalados em posições frontais aos aquíferos considerados promissores no perfil estratigráficos. O revestimento evita que os filtros entrem em contato direto com a parede de perfuração.

### 3.3 APLICAÇÃO DE PRÉ-FILTRO

No espaço anelar remanescente entre as paredes do furo e o revestimento deverá ser injetado pré-filtro selecionado de quartzo na granulométrica de 1 mm a 4mm, para formação de um envoltório filtrante e estabilizado da formação, a fim de evitar desmoronamento e entrada de materiais granulares para dentro do poço.

### 3.4 LAJE DE PROTEÇÃO DO POÇO

Depois de concluído todos os serviços do poço, deverá ser construída uma laje de concreto ciclópico, fundida no local, envolvendo tubo de edutor. A mesma deverá apresentar inclinações do centro da borda a fim de evitar infiltrações de águas superficiais.

### 3.5 LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO DO POÇO

Deverá ser realizada com o uso de compressor de alta pressão (sistema airlift), a limpeza inicial para a retirada de sólidos e partículas não desejadas. Depois deverão ser utilizados produtos químicos dispersantes destinados a desencrustar os filtros e promover o desenvolvimento do poço, assim como agregar as partículas finas existentes e sólidos não desejados a limpeza do poço é feita no período de seis meses, a segunda em um ano, gerando custos, ficando assim por conta do contratante.

### 3.6 TESTE DE VAZÃO

Ainda com o compressor será feito o teste de vazão após a limpeza e desenvolvimento, por um período mínimo de 24hs de bombeamento ininterrupto,



quando se fará o monitoramento da bomba a ser instalada.

### 3.7 BOLETIM DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E BACTERIOLÓGICAS

O Boletim de análises físico-química e bacteriológica será de responsabilidade do Município de Itaituba o Contratante, e deverá atender ao que determina a Portaria n.º 2.914, de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde, republicada no DOU no dia 12/12/2011, que estabelece os procedimentos e responsabilidade da água para consumo humano.

### 3.8 PRAZO DE EXECUÇÃO

**60 (Sessenta) dias por poço**, salvo motivos de força maior.

Obs.: a Obra só poderá ser dada por finalizada após a comprovação do teste de vazão e do Boletim de análise físico-químico e bacteriológica da água do poço.

Itaituba, 06 de Novembro de 2017

*Lana Sabryna S. Aguiar*  
Engenheira Civil  
Crea. Pa 151604296-4

*Lana Sabryna S. Aguiar*  
LANA SABRYNA SIMÕES AGUIAR  
Engenheira Civil - CREA nº 151604296-4 - PA

*Ulisses Moreira Conde*  
ULISSES MOREIRA CONDE  
Técnico em Edificações - CREA 476-TD-PA

*Ulisses Moreira Conde*  
Ulisses Moreira Conde  
Técnico em Edificações  
CREA 476-TD-PA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
Prefeitura Municipal de Itaituba  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**  
**DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS**



**LAUDO DE VISTORIA TÉCNICA Nº 052/2017**

*De: SEMINFRA – Diretoria Técnica e de Obras*

*Requerente: Secretaria Municipal de Educação – SEMED*

Sr. Amilton Teixeira Pinho – Secretário de Municipal de Itaituba  
Decreto nº 006/17 de 02/01/17

*Assunto: Vistoria Técnica de Justificativa da necessidade da Perfuração de um Poço.*

*Endereço da Obra: Escola Ed. Inf. Dom Pedro I-Itaituba/Pará.*

*Data de Expedição: 21/11/2017.*

Em resposta ao questionamento da necessidade da Perfuração de um Poço semi-artesiano na Escola Ed. Inf. Dom Pedro I, **Declaramos** que:

Após vistoria “IN LOCO”, constatou-se de imediato a deficiência e a falta de um Poço Semi-artesiano na Escola citada acima, onde o pleito se justifica em face da necessidade de oferecer uma melhor infraestrutura no que concerne ao fornecimento de água potável e de boa qualidade para os alunos da Escola acima mencionada. A água que é utilizada hoje para beber e cozinhar a merenda vem de uma perfuração no solo sem tratamento adequado que consequentemente causa risco aos alunos. A Perfuração de um Poço Artesiano visa, sobretudo, o abastecimento humano, animal e da comunidade em geral na qual necessita também da utilização dessa água. E mediante a essas informações tendo a Prefeitura Municipal de Itaituba, na Gestão do Sr. Valmir Climaco de Aguiar a intensão de oferecer condições melhores e necessárias a saúde da população, reduzindo as enfermidades, controlando as doenças endêmicas e parasitárias, dando assim, mais qualidade de vida aos Itaitubenses, pretende implantar um Poço Semi-Artesiano na Escola citada acima.

Conforme a constatação visual da problemática da referida Escola em questão, onde de imediato detectou-se a necessidade de Perfuração do Poço, para que possa atender as necessidades básicas da Escola e da Comunidade ao redor.

Mediante a este relato contundente acima citado, tendo os técnicos desta vistoria consciencia da necessidade dessa contrução. Pelo exposto é que emitimos o parecer favorável para que seja feito em caráter de **URGÊNCIA**, a Perfuração da Poço semi-artesiano.

A presente Vistoria Técnica foi realizada no dia 21 de Novembro de 2017.

  
Ulisses Moreira Conde  
Técnico em Edificações  
Crea 476-TD-PA

  
Lana Sadyria S. Aguiar  
Engenheira Civil  
Crea 157420-PA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
Prefeitura Municipal de Itaituba  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**  
**DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS**



**LAUDO DE VISTORIA TÉCNICA Nº 052/2017**

*Espera-se que o setor competente deste conceituado Órgão Público resolva esta questão da melhor forma possível.*

Sendo assim, era o que se tinha para o momento, esperando ser compreendido e atendido.

Desde já as nossas considerações.

Itaituba, PA 21 de Novembro de 2017.

*Lana Sabryna S. Aguiar*

**LANA SABRYNA SIMÕES AGUIAR**

Engenheira Civil - CREA nº 151604296-4 - PA






**Lana Sabryna S. Aguiar**  
Engenheira Civil  
Crea-Pa 151604296-4

*Ulisses Moreira Conde*

**ULISSES MOREIRA CONDE**

Técnico em Edificações - CREA 476/TD

*Ulisses Moreira Conde*  
**Ulisses Moreira Conde**  
Técnico em Edificações  
Crea 476-TD-PA

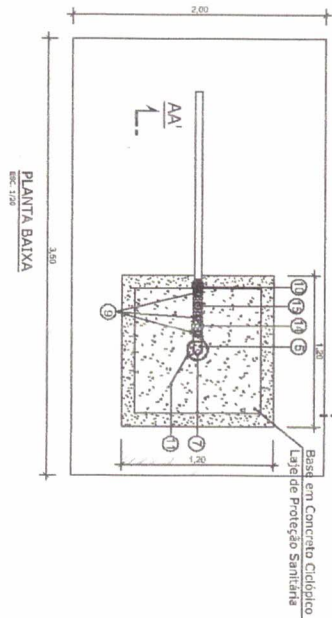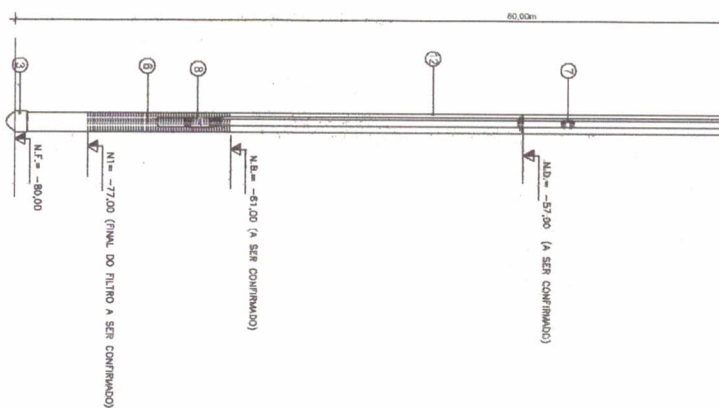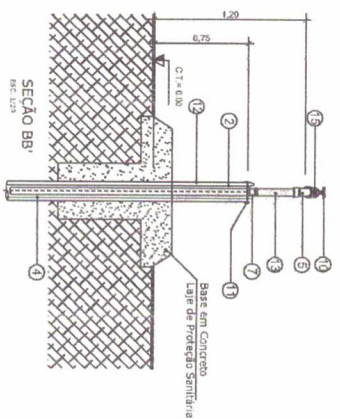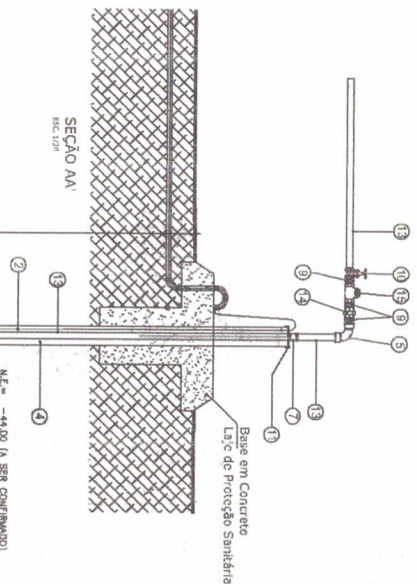

SITUAÇÃO: DEC. 13.955

**LISTA DE MATERIAL PARA O POÇO**

| ITEM | DESCRIÇÃO                           | UNIDADE | QTD. | QUANT. |
|------|-------------------------------------|---------|------|--------|
| 1    | Abertura de 10cm                    | m       | 100  | 10     |
| 2    | Cabo 1/2" de 10m (Cabo 1/2" de 10m) | m       | 100  | 10     |
| 3    | Cabo 1/2" de 10m (Cabo 1/2" de 10m) | m       | 100  | 10     |
| 4    | Cabo 1/2" de 10m (Cabo 1/2" de 10m) | m       | 100  | 10     |
| 5    | Cabo 1/2" de 10m (Cabo 1/2" de 10m) | m       | 100  | 10     |
| 6    | Cabo 1/2" de 10m (Cabo 1/2" de 10m) | m       | 100  | 10     |
| 7    | Cabo 1/2" de 10m (Cabo 1/2" de 10m) | m       | 100  | 10     |
| 8    | Cabo 1/2" de 10m (Cabo 1/2" de 10m) | m       | 100  | 10     |
| 9    | Cabo 1/2" de 10m (Cabo 1/2" de 10m) | m       | 100  | 10     |
| 10   | Cabo 1/2" de 10m (Cabo 1/2" de 10m) | m       | 100  | 10     |
| 11   | Cabo 1/2" de 10m (Cabo 1/2" de 10m) | m       | 100  | 10     |
| 12   | Cabo 1/2" de 10m (Cabo 1/2" de 10m) | m       | 100  | 10     |
| 13   | Cabo 1/2" de 10m (Cabo 1/2" de 10m) | m       | 100  | 10     |
| 14   | Cabo 1/2" de 10m (Cabo 1/2" de 10m) | m       | 100  | 10     |
| 15   | Cabo 1/2" de 10m (Cabo 1/2" de 10m) | m       | 100  | 10     |

**Uliques Moreira Conde**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-PA 151604/2008

**SEMINFRA**  
 SEMINÁRIO DE INFRAESTRUTURA  
 MUNICÍPIO DE ITATUBA

**PROPOSTA DE PROJETO**  
 PROJETO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO AVEL  
 MUNICÍPIO DE ITATUBA

**NOTAS:**  
 1- DIMENSÕES EM METRO, EXETO ONDE INDICADO.  
 2- A COTA DO NÍVEL DO TERRENO SERVE COMO REFERÊNCIA P/ OS DEMAIS NÍVEIS.
